

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 成都龙泉林家堰 110kV 输变电工程

项 目 编 号 成发改核准[2020]7 号

建 设 地 点 成都市龙泉驿区

验 收 单 位 国网四川省电力公司天府新区供电公司

2022 年 2 月 9 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	成都龙泉林家堰 110kV 输变电工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司天府新区供电公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	成都市龙泉驿区行政审批局，龙水保表审批[2020]第 3 号，2020 年 6 月 23 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司 川电建设[2020]119 号、2020 年 5 月 22 日		
项目建设起止时间	2020 年 9 月至 2021 年 9 月		
水土保持方案编制单位	四川嘉源生态发展有限责任公司		
水土保持初步设计单位	成都城电电力工程设计有限公司		
水土保持监测单位	国网四川省电力公司天府新区供电公司		
水土保持施工单位	国网四川电力送变电建设有限公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后管理规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后管理规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知》（川水函〔2018〕887号）的要求，工程投运前需完成水土保持设施竣工验收工作，国网四川省电力公司天府新区供电公司于2022年2月9日在成都主持召开了成都龙泉林家堰110kV输变电工程水土保持设施验收会议，参加验收的单位有建设单位国网四川省电力公司天府新区供电公司、水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位、验收报告编制单位等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，建设单位对成都龙泉林家堰110kV输变电工程水土保持设施进行了自查初验。四川电力设计咨询有限责任公司对成都龙泉林家堰110kV输变电工程水土保持设施进行了技术验收，提交了验收报告。

验收组成员与参会代表查阅了过程现场照片及技术资料，就工程建设过程中的水土保持问题及水土保持设施验收情况与建设单位及验收报告编制单位沟通，经质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

1、成都龙泉林家堰110kV输变电工程位于成都市龙泉驿区境

内,属新建工程,工程由林家堰 110kV 变电站新建工程、大面 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程、红砂 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程、大面~林家堰 110kV 线路工程、红砂~林家堰 110kV 线路工程 5 部分组成。

林家堰 110kV 变电站新建工程:站址位于成都市龙泉驿区大面铺镇蒲草村,运行名为东安湖 110kV 变电站,建设规模为:主变容量 $2\times 63\text{MVA}$,110kV 出线 2 回,10kV 出线 26 回,电容补偿 $2\times(6+6)\text{MVar}$;

大面 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程:在预留场地内扩建,场地布置与变电站原布置相一致,新建避雷器及电压互感器支架及基础。

红砂 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程:在预留场地内扩建,场地布置与变电站原布置相一致,设备基础已建成,仅进行了设备的安装,不存在土建工程。

大面~林家堰 110kV 线路工程:线路全长 2.600km,为电缆线路,线路利用已建电缆沟走线,不涉及土建。

红砂~林家堰 110kV 线路工程:线路全长 8.051km,其中架空线路 0.051km,电缆线路 8.0km,架空线路利用已建电缆终端杆,电缆线路利用已建电缆沟走线,不涉及土建。

工程实际于 2020 年 9 月开工,2021 年 9 月建成,2021 年 9 月水保措施完工。

2、项目总占地面积 0.64m^2 ,其中永久占地 0.54hm^2 、临时占

地 0.10hm²。

3、工程建设总挖方 0.23 万 m³，总填方 0.49 万 m³，借方 0.26 万 m³，无弃土弃渣产生，不设置弃渣场；本工程外购砂石料均采购于合法供应商，未单独设置取土场。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2020 年 6 月 23 日，成都市龙泉驿区行政审批局以龙水保表审批[2020]第 3 号文件对该项目水保方案报告表作了批复，批复的本工程水保方案中水土流失防治责任范围为 0.70hm²。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持设计纳入主体工程一并设计。

（四）水土保持监测情况

工程建设过程中未开展专项水土保持监测工作，建设单位自行对工程建设过程中的水土流失情况开展巡查监测，监测结论为：工程建设中落实了水土保持方案确定的防治体系及任务，完成的措施基本与方案一致，有效控制和减少了工程建设中的水土流失，水土保持设施完好率较高，发挥了水土保持效益。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2020 年 10 月，建设单位委托四川电力设计咨询有限责任公司开展工程的水土保持验收报告编制工作。接受委托后，四川电力设计咨询有限责任公司成立了项目验收工作组，多次到现场进行勘察，于 2021 年 12 月编制完成了《成都龙泉林家堰 110kV 输变电工程水土保持设施验收报告》。

工程实施的水保措施有：排水沟 275m，排水管 256m、表土剥

离及回覆 175m³、土地整治 0.14hm²，复耕 0.10hm²，碎石铺设 10m²，撒播种草 0.14hm²，临时排水沟 280m，临时沉砂池 3 口，防雨布遮盖 500m²，密目网遮盖 4000m²。工程质量合格，建成后水土流失已得到有效控制。

通过经济财务评估，工程实际完成水土保持投资 45.10 万元，其中：水土保持专项投资 44.19 万元，水土保持补偿费 0.91 万元。水土保持专项投资中，工程措施费 24.68 万元，植物措施费 0.21 万元，临时措施费 5.42 万元，独立费用 9.88 万元。

经生态效益评估，该项目水土保持防治效果明显，项目建设区域内工程水土流失治理度达到 98.4%，土壤流失控制比达到 1，渣土防护率达到 97.3%，表土保护率达到 99.9%，林草植被恢复率 99.9%，林草覆盖率达到 21.9%。6 项防治指标均达到并超过防治目标要求。

综上所述，本工程建设相关手续资料齐备，水土保持措施落实完善，水土保持投资满足区域水土保持防治要求，防治效果明显，满足水土保持相关法律法规要求。水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保持方案的有关规定和要求，各项工程安全可靠、质量合格，效益显著，水土保持生态环境建设设施的管理维护责任明确，工程总体质量达到了设计标准，符合验收条件，可以进行竣工验收。

（六）验收结论

验收组认为：本项目实施过程中落实了批准的水土保持方案及相关文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案设计的目标值，足额缴纳了水土保持补偿费，


符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保正常运行和发挥效益。

三、项目区照片

变电站现状照片

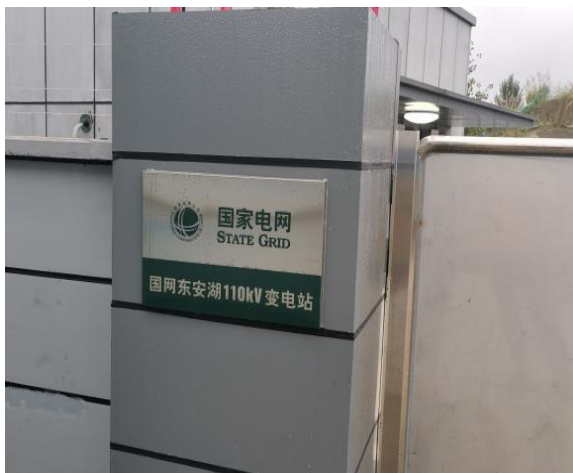

林家堰变电站（运行名东安湖变电站）大门



大面变电站间隔扩建区域现状



变电站内部现状

水土保持措施照片



站外植被恢复



站外植被恢复及密目网覆盖



临时排水沟和临时沉砂池



临时堆土密目网覆盖



站外排水沟情况（施工过程中）

站外排水沟情况（施工结束后）



施工营地复耕及密目网覆盖

施工营地复耕及密目网覆盖

四、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	樊志华	国网四川省电力公司 天府新区供电公司	工程师	樊志华	建设单位
成员	凌文州	西南电力设计院	教 高	凌文州	特邀专家
	张小瑄	国网四川省电力公司 天府新区供电公司	高级工程师	张小瑄	建设单位
	张 敏	国网四川省电力公司 天府新区供电公司	高级工程师	张敏	
	李 怡	国网四川省电力公司 天府新区供电公司	工程师	李怡	
	黄 晗	国网四川省电力公司 天府新区供电公司	工程师	黄晗	
	邓 川	四川电力设计咨询有 限责任公司	工程师	邓川	验收报告编 制单位
	杨晓瑞	四川电力设计咨询有 限责任公司	高级工程师	杨晓瑞	
	陈 均	四川东祥工程项目管 理有限责任公司	总 监	陈均	监理单位
	李兴隆	四川嘉源生态发展有 限责任公司	工程师	李兴隆	水保方案编 制单位
	王金泉	国网四川电力送变电 建设有限公司	经 理	王金泉	施工单位
