

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 东坡 500kV 变电站主变扩建工程

项 目 编 号 川发改能源〔2021〕80 号

建 设 地 点 四川省眉山市东坡区

验 收 单 位 国网四川省电力公司建设分公司



2023 年 1 月 12 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	东坡 500kV 变电站主变扩建工程	行业类别	输变电
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司建设分公司	项目性质	扩建
水土保持方案批复机关、文号及时间	四川省水利厅 川水许可〔2021〕26 号，2021 年 10 月 29 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司 川电建设〔2021〕159 号，2021 年 7 月 26 日		
项目建设起止时间	2022 年 1 月~2022 年 12 月		
水土保持方案编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司		
水土保持初步设计单位	成都城电电力工程设计有限公司		
水土保持监测单位	四川蔚蓝天空环境科技有限责任公司		
水土保持施工单位	国网四川电力送变电建设有限公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	四川金原工程勘察设计院有限责任公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《四川省水利厅转发关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）等文件精神，2023年1月12日，国网四川省电力公司建设分公司在眉山市东坡区主持召开了东坡500kV变电站主变扩建工程水土保持设施验收会。参加会议的有特邀专家，水土保持设施验收报告编制单位四川金原工程勘察设计有限责任公司，主体监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司，水土保持监测单位四川蔚蓝天环境科技有限责任公司，水土保持方案编制单位四川电力设计咨询有限责任公司，施工单位国网四川电力送变电建设有限公司等参建单位的代表，成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表会前对现场进行了踏勘，会议上查阅了影像、技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况的汇报，以及设计、监理、、监测、施工等单位的补充说明：

（一）项目概况

东坡500kV变电站主变扩建工程位于四川省眉山市东坡区

的松江镇山坝村和思蒙镇石砣村。工程在原东坡 500kV 变电站内扩建 750MVA 主变压器 1 台（3 号主变）；3 号主变 35kV 侧新建 2 组 60Mvar 并联电容器，原 2 号主变 35kV 侧 2 组 60Mvar 并联电抗器回路改接至 3 号主变，1 组 60Mvar 并联电抗器调整布置，拆除 1 组 40Mvar 并联电容器。工程总投资 7027.9776 万元，其中土建投资 844.3165 万元，工程建设投资资金来源为：自有资本金 20%（国网四川省电力公司自筹），银行贷款 80%。本工程实际施工总工期为 12 个月，于 2022 年 1 月开工，2022 年 12 月竣工。

（二）水土保持方案批复情况

2021 年 10 月 29 日，四川省水利厅以《水土保持行政许可承诺书》（川水许可〔2021〕26 号）对工程水土保持方案报告表进行了批复。

同意本项目水土流失责任范围 0.76hm²，土石方挖方 6087m³（其中表土剥离 700m³），回填 860m³（其中表土利用方 700m³），弃方 5227m³。弃土和建渣全部运至丁塘村一二组取土场回填处理。水土保持投资 47.86 万元，其中工程措施 14.07 万元，植物措施 9.40 万元，临时措施 2.72 万元，独立费用 18.02 万元，基本预备费 2.65 万元，水土保持补偿费 0.988 万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2021 年 7 月，成都城电电力工程设计有限公司编制完成了

《四川眉山东坡 500kV 变电站主变扩建工程初步设计》。2021 年 7 月 26 日，国网四川省电力公司以《国网四川省电力公司关于昭化 500kV 变电站主变增容扩建等三项工程初步设计的批复》（川电建设〔2021〕159 号）对工程初步设计进行了批复。

2021 年 12 月，成都城电电力工程设计有限公司编制完成了《四川眉山东坡 500kV 变电站主变扩建工程施工图设计》。

经查阅，上述相关设计文件中含有水土保持专章或水土保持措施设计，已落实了水土保持后续设计。

（四）水土保持措施实施情况

1、水土流失防治责任范围

项目实际水土流失防治责任范围为 0.76hm^2 ，项目建设划分为 1 个防治分区，即主变扩建工程区。与批复水土保持方案一致。

2、土石方工程量及弃方处置

根据主体工程竣工决算资料及主体工程监理成果资料，工程实际开挖土石方 6491m^3 （其中表土剥离 688m^3 ），实际回填土石方 1187m^3 （其中表土利用方 688m^3 ），弃方 5304m^3 。弃土和建渣全部运至丁塘村一二组取土场回填处理。土石方挖填数量较批复水土保持方案增加 731m^3 ，增加率为 10.52%；弃方较批复水土保持方案增加 77m^3 ，增加率为 1.47%。土石方挖填及弃方数量与批复水土保持方案未发生较大变化，弃方处置方式与批复水土

保持方案一致。

3、水土保持措施工程量

①批复方案确定的水土保持措施

工程措施：排水管道 292m（主体已列），土地整治 0.60hm²（方案新增），表土剥离 700m³（方案新增），覆土 700m³（方案新增）；

植物措施：植草绿化 0.60hm²（主体已列）；

临时措施：土袋拦挡 35m³（方案新增），防雨布隔离 660m²（方案新增），防雨布覆盖 720m²（方案新增）。

②实际完成的水土保持措施

工程措施：DN400 钢筋混凝土雨水管 210m（主体已列），DN300 钢筋混凝土雨水管 50m（主体已列），DN200 焊接钢管雨水管 10m（主体已列），DN300 焊接钢管雨水管 12m（主体已列），DN100PVC-U 排水管 10m（主体已列）， ϕ 1000 砖砌雨水检查井 11 座（主体已列），单篦雨水口 2 个（主体已列），表土剥离 688m³（方案新增），覆土 688m³（方案新增），土地整治 0.60hm²（方案新增）。

植物措施：植草绿化 0.60hm²（主体已列）；

临时措施：土袋临时拦挡 40m³（方案新增），防雨布隔离 640m²（方案新增），防雨布覆盖 810m²（方案新增），基坑边

坡防护 301m²（主体已列）。

③变化情况

本项目实际完成水土保持措施较批复的水土保持方案确定的水土保持措施发生了一定变化。其中：

工程措施：雨水管网长度未发生变化，但实际实施明确了雨水管网的规格及材质。增加了 $\phi 1000$ 砖砌雨水检查井 11 座，单篦雨水口 2 个，变土剥离减少 12m³，覆土减少 12m³。

植物措施：未发生变化。

临时措施：土袋临时拦挡增加了 5m³，防雨布隔离减少了 20m²，防雨布覆盖增加了 90m²，基坑边坡防护增加了 301m²。

4、水土保持投资及变化原因

①批复方案确定的水土保持投资

本项目经批复的水土保持方案确定本工程水土保持总投资为 47.86 万元，其中工程措施 14.07 万元，植物措施 9.40 万元，临时措施 2.73 万元，独立费用 18.02 万元，基本预备费 2.65 万元，水土保持补偿费 0.988 万元。

②实际完成的水土保持投资

本工程实际完成水土保持措施总投资 71.89 万元，其中工程措施 12.91 万元、植物措施 19.78 万元、临时措施 20.51 万元），

独立费用 17.70 万元，水土保持措施补偿费 0.988 万元。

③投资变化

本项目实际完成水土保持投资较方案阶段增加了 24.03 万元。

④变化原因

本项目实际完成的水保投资与批复水保方案的投资相比，增加了 26.03 万元。主要原因为：工程措施投资较批复投资减少了 1.16 万元。主要原因是方案编制时，主体工程处于初设阶段，后续主体工程在工程建设过程中核减了表土剥离及回覆数量，排水工程根据实际发生金额进行统计，投资有所减少，因此实际完成的工程措施投资较批复的水土保持方案设计的工程措施投资有所减少；植物措施投资较批复投资增加 10.38 万元。主要原因是植物单价的提高，因此投资增加；施工临时工程费增加了 17.78 万元，主要是主体工程在施工过程中增加了基坑的临时防护措施，因此造成投资增加；独立费用按照建设单位与相关单位签订的合同金额为准，取消了建设管理费，独立费用减少 0.32 万元；基本预备费减少 2.65 万元，主要原因是各项投资已按实际发生计算，项目基本预备费不存在；本工程水土保持补偿费实际缴纳金额为 0.988 万元，与方案确定的水土保持补偿费一致，建设单位已于 2021 年 12 月 7 日足额缴纳。

（五）水土保持监测情况

根据水土保持方案及现场调查，本项目工程扰动土地面积 0.76hm^2 ，方案确定的水土流失六项防治目标值情况分别为水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1，渣土防护率 92%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 25%。

至工程建设期结束时，水土保持防治效果明显，水土流失六项防治实现值为水土流失治理度 98.33%，土壤流失控制比 1.43，渣土防护率 99.00%，表土保护率 100%，林草植被恢复率 98.33%，林草覆盖率 77.63%，六项防治标准均能达到方案确定的目标值。

（六）水土保持补偿费缴纳情况

2021 年 12 月 7 日，建设单位向国家税务总局眉山市东坡区税务局缴纳水土保持补偿费 9880.00 元，与批复的水土保持补偿费一致。

（七）验收结论

验收组认为：东坡 500kV 变电站主变扩建工程实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，实施了相应的水土保持工程、植物及临时措施，完成了水土流失防治任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案目标值，依法足额缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收条件，同意本项目水土保持设施通过验收。

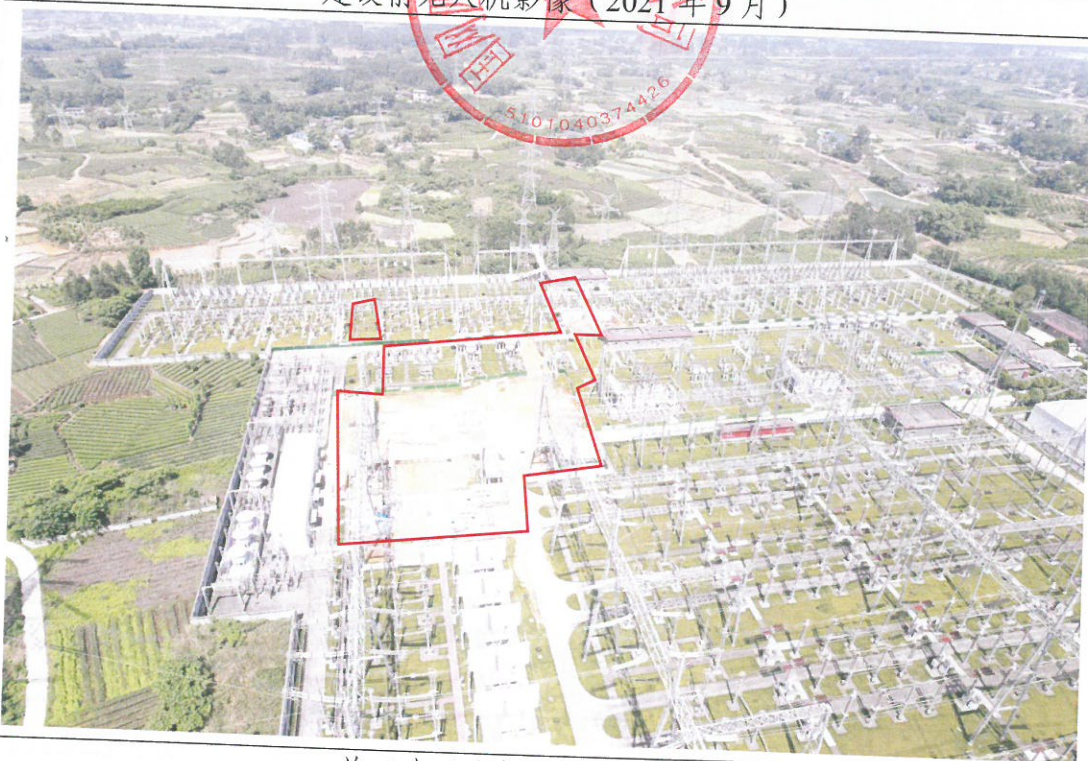
（八）后续管护要求

本工程运行管理由国网四川省电力公司超高压分公司负责，运行期应继续完善、管护工程的水土保持措施；在后续管理工作中应加强植被的抚育和管理；强化现有水土保持设施的管理、养护工作，巩固现有水土保持措施成果，并做好记录；今后工作中，加强与地方水行政主管部门联系，争取地方各级部门的指导和支持。


三、现场照片



建设前无人机影像（2021年9月）



施工中无人机影像（2022.4）

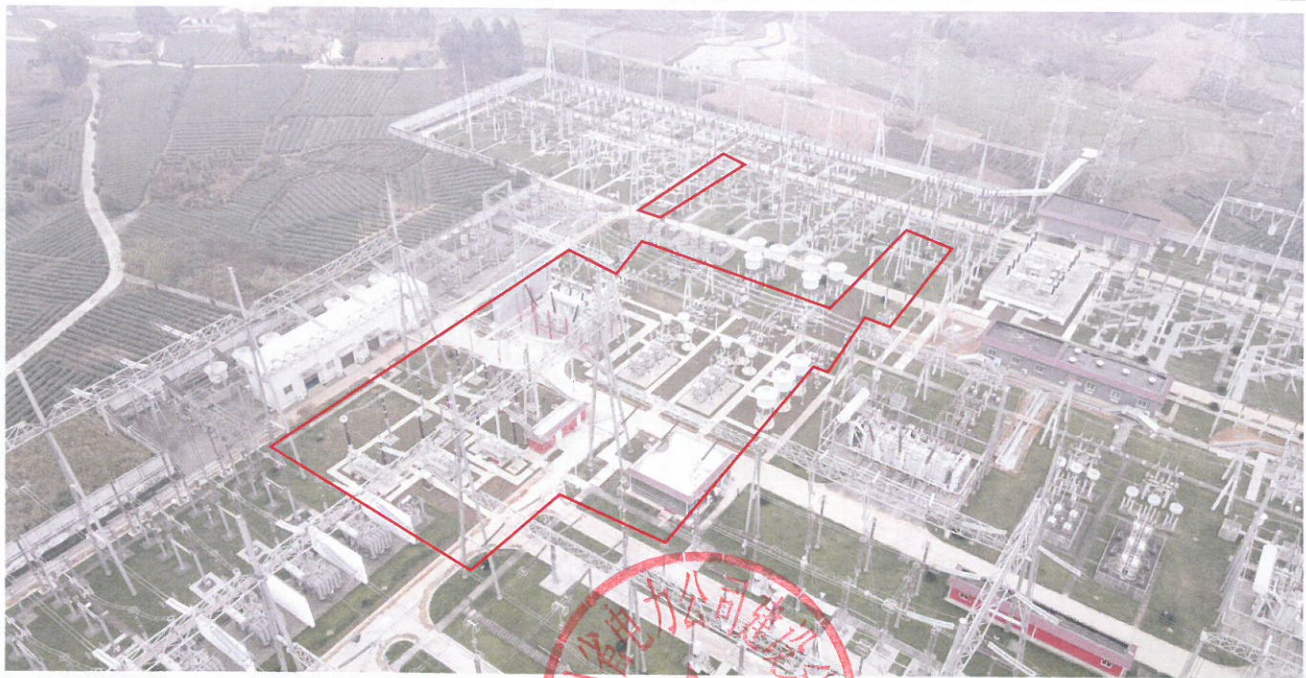

建设后无人机影像（2022 年 12 月）



排水设施



排水设施







植物措施



植物措施

四、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签字	备注
组 长	杨 彬	国网四川省电力公司 建设分公司	副主任		建设单位
成 员	杨建霞	四川电力设计咨询有 限责任公司	高级工程师		特邀专家
	彭健伟	国网四川省电力公司 建设分公司	项目经理		建设单位
	黄子轩	国网四川省电力公司 建设分公司	高级工程师		建设单位
	李明俊	四川金原工程勘察设 计有限责任公司	高级工程师		验收报告 编制单位
	曾谋锡	四川东祥工程项目管 理有限责任公司	总 监		主体监理
	张贝克	四川蔚蓝天空环境科 技有限责任公司	工程师		水土保持 监测单位
	尹武君	四川电力设计咨询有 限责任公司	高级工程师		水土保持 方案编制 单位
	赖长春	国网四川电力送变电 建设有限公司	项目经理		施工单位

五、附件

(1) 立项文件

四川省发展和改革委员会文件

川发改能源〔2021〕80号

四川省发展和改革委员会 关于东坡 500 千伏变电站主变扩建工程 项目核准的批复

国网四川省电力公司：

报来《关于呈批核准东坡 500 千伏变电站主变扩建工程项目的请示》（川电发展〔2020〕222 号）以及省政府政务服务中心《窗口收件通知书》（项目编号：2020-510000-44-02-527422）收悉。经研究，现将东坡 500 千伏变电站主变扩建工程项目核准事项批复如下：

一、为满足眉山中部地区负荷发展需要，同意建设东坡 500

千伏变电站主变扩建工程。该项目属于国家发展改革委第 36 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类中的电力领域，符合国家产业政策和我省电力发展规划。

二、项目建设地点为眉山市东坡区。

三、项目建设主要内容：

（一）现有主变规模 2×750 兆伏安，本期扩建 3 号主变，主变容量 750 兆伏安，主变终期规模 3×750 兆伏安；

（二）3 号主变低压侧配置 2 组 60 兆乏低压电容器、同时将 2 号主变低压侧 2 组并联电抗器改接至 3 号主变，将原 2 号主变 1 组 40 兆乏低容拆除，最终形成 2 号主变低压侧 2 组 40 兆乏低压电容器和 1 组 60 兆乏低压电抗器，3 号主变低压侧 2 组 60 兆乏低压电容器和 2 组 60 兆乏低压电抗器。

四、工程总投资 7229 万元，其中资本金占 20%，其余资金通过银行贷款解决。国网四川省电力公司作为项目法人，负责工程建设、经营管理、资本金筹措及贷款偿还等。

五、项目招标事项核准意见见附件。项目法人应严格按照《招标投标法》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等规定和本核准内容进行招标投标活动。

六、项目的相关文件是：四川省工程咨询院评估意见（川工咨成果〔2021〕79 号），项目技术方案（经研咨〔2020〕912

号),市(州)意见(眉市发改能源〔2020〕289号),社会影响评价(眉稳评备〔2020〕66号)。

七、本工程规划设计符合《火力发电厂与变电所设计防火标准》(GB50299-2019)等相关规范关于消防的要求,在工程建设中要进一步严格落实符合条件的消防配置及措施并按规定验收。

八、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整,请按照《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》(川办发〔2018〕23号)的有关规定,及时以书面形式向我委提出调整申请,我委将根据项目具体情况,出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

九、请国网四川省电力公司在项目开工建设前,依据相关法律法规的规定,完成项目开工建设所需相关手续。

十、本核准文件有效期限为2年,自发布之日起计算。项目在核准文件有效期内未开工建设的,应在核准文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的,或虽提出延期申请但未获批准的,本核准文件自动失效。

十一、请眉山市发展改革委加强对该项目建设中的协调和服务工作,保障工程建设环境;督促项目法人做好施工组织,

严控工程质量，严格落实森林草原输电设施防灭火工作有关要求。项目法人要切实履行安全生产责任，确保施工安全，严格落实输变电设施防火相关措施。

附件：审批部门招标核准意见

四川省发展和改革委员会

2021年3月12日



附件:

审批部门招标核准意见

建设项目名称: 东坡 500 千伏变电站主变扩建工程

	招标范围		招标方式		招标组织形式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	公开招标	邀请招标	委托招标	自行招标	
勘察设计	全部招标		公开招标		委托招标		
施 工	全部招标		公开招标		委托招标		
监 理	全部招标		公开招标		委托招标		
与工程建设有关的重要设备和材料	全部招标		公开招标		委托招标		

审批部门核准意见说明:

1. 招标范围: 勘察设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备和材料。同一项目中可以合并进行的勘察、施工、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购, 合同估算价合计达到必须招标规模标准的, 必须招标。

2. 招标方式: 公开招标。招标公告应当在指定媒介发布, 招标人自愿的, 也可同时在其他媒介发布。

3. 招标组织形式: 委托招标。招标代理机构按规定进行比选。招标过程中报送各项备案材料由招标代理机构负责。

4. 评标标准应在招标文件中详细规定, 除此之外不得另行制定任何标准和细则。评标专家的确定按《四川省评标专家库管理办法》(川办发〔2003〕13 号) 的规定执行。

四川省发展和改革委员会 (盖章)

2021 年 3 月 12 日



信息公开选项：主动公开

抄送：生态环境厅，自然资源厅，省统计局，四川能源监管办，眉山市发展改革委。

四川省发展和改革委员会办公室

2021年3月12日印发



内部事项

咨询部 张梦 2021-07-28

国网四川省电力公司文件

国网四川省电力公司建设分公司前期业务咨询部 张梦 2021-07-28

川电建设（2021）159号

2021-07-28

国网四川省电力公司关于昭化 500kV 变电站 主变增容扩建等三项工程初步设计的批复

国网四川省电力公司建设分公司前期业务咨询部 张梦 2021-07-28

国网四川省电力公司建设分公司：

2021-07-28

《国网四川省电力公司建设分公司关于呈批昭化 500 千伏变电站主变增容扩建等三项工程初步设计的请示》（川电建设司（2021）39 号）收悉。经研究，原则同意上述工程初步设计。现批复如下：

一、昭化 500kV 变电站主变增容扩建工程

1-07-28

本期建设新增 1000MVA 主变压器 1 组（3 号），将原 1 号、2 号主变增容为 1000MVA；220kV 扩建 2 回出线，至石盘铝；3 号主变 35kV 侧装设 2 组 60Mvar 并联电容器；由于原 1 号、2 号主变 220kV 进线回路电流互感器额定电流不满足增容后需求，本期

国网四川省电力公司建设分公司前期业务咨询部 张梦 2021-07-28

更换。

二、广都 500kV 变电站主变扩建工程

本期建设1200MVA主变压器1组（3号）；3号主变66kV侧新装设3组60Mvar并联电容器、1组60Mvar并联电抗器和1套180MvarSVC动态无功补偿装置。

三、东坡 500kV 变电站主变扩建工程

本期建设站区内扩建750MVA主变压器1台（3号主变）；3号主变35kV侧新建2组60Mvar并联电容器，原2号主变35kV侧2组60Mvar并联电抗器回路改接至3号主变，1组60Mvar并联电抗器调整布置，拆除1组40Mvar并联电容器。

四、概算投资

（一）批复昭化 500kV 变电站主变增容扩建工程动态总投资 15018 万元，控制在核准动态总投资 15745 万元以内；批复广都 500kV 变电站主变扩建工程动态总投资 11156 万元，核准动态总投资 10818 万元，较核准增加 338 万元，超出比例为 3.12%，主要原因是变电设备价格上涨；批复东坡 500kV 变电站主变扩建工程动态总投资 7371 万元，核准动态总投资 7229 万元，较核准增加 142 万元，超出比例为 1.96%，主要原因是变电设备价格上涨。工程概算汇总表见附件，工程技术方案及概算投资详见评审意见。

（二）在工程建设过程中，工程建设单位要切实加强工程建设管理，有效控制工程造价，严格按照初步设计批复开展工程建设。重大设计变更和签证费用应严格按《国家电网公司输变电工

程设计变更与现场签证管理办法》（2017年版）规定报批。本工程应在竣工后100日内按《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（2019年版）完成竣工结算。

附件：1.昭化 500kV 变电站主变增容扩建工程概算汇总表
2.广都 500kV 变电站主变扩建工程概算汇总表
3.东坡 500kV 变电站主变扩建工程概算汇总表

国网四川省电力公司

2021 年 7 月 26 日

（此件不公开发布，发至收文单位本部。未经公司许可，严禁以任何方式对外传播和发布，任何媒体或其他主体不得公布、转载，违者追究法律责任。）

昭化 500kV 变电站主变增容扩建工程概算汇总表

金额单位：万元

序号	工程或费用名称	建设规模	静态投资		动态投资
			静态投资	其中：场地征用及清理费	
一	变电工程		14756	324	15018
1	昭化 500kV 变电站主变增容扩建工程	扩建 1000MVA 主变压器 1 组； 将原 2 组 750MVA 主变压器增容至 2 组 1000MVA	14756	324	15018
	合 计		14756	324	15018
	其中：可抵扣固定资产增值税额		1392		

广都 500kV 变电站主变扩建工程概算汇总表

金额单位：万元

序号	工程或费用名称	建设规模	静态投资		动态投资
			静态投资	其中：场地征用及清理费	
一	变电工程		10962	19	11156
1	广都 500kV 变电站主变扩建工程	扩建 1200MVA 变压器 1 组	10962	19	11156
	合 计		10962	19	11156
	其中：可抵扣固定资产增值税额		1182		

东坡 500kV 变电站主变扩建工程概算汇总表

金额单位：万元

序号	工程或费用名称	建设规模	静态投资		动态投资
			静态投资	其中：场地征用及清理费	
一	变电工程		7234	70	7371
1	东坡 500kV 变电站主变扩建工程	扩建 750MVA 主变压器 1 台	7234	70	7371
	合 计		7234	70	7371
	其中：可抵扣固定资产增值税额		690		

前期业务咨询部 张梦 2021-07-28

国网四川省电力公司

前期业务咨询部 张梦 2021-07-28

国网四川省电力公司建设分公司 前期业务咨询部 张梦 2021-

分公司 前期业务咨询部 张梦 2021-07-28

国网四川省电力公司建设分公司 前期业务咨询部

分公司 前期业务咨询部 张梦 2021-07-28

国网四川省电力公司建设分公司 前期业务咨询部

国网四川省

抄送：国网四川省电力公司经济技术研究院。

国网四川省电力公司办公室

2021 年 7 月 26 日印发

(2) 水土保持方案批复

水土保持行政许可承诺书

编号：川水许字〔2021〕26号

项目名称	东坡 500kV 变电站主变扩建工程		
建设地点	四川省眉山市东坡区		
区域评估情况	开发区名称：无		
	水土保持区域评估报告审批机关、文号及时间： 无		
水土保持方案公开情况	公示网站： http://www.sc.sgcc.com.cn/html/main/col2749/2021-09/17/20210917085740616644765_1.html		
	起止时间：2021 年 09 月 17 日至 2021 年 09 月 30 日		
	公众意见接收和处理情况： 无		
生产建设单位	名称：国网四川省电力公司建设分公司		
	统一社会信用代码：91510000MA629WKP83		
	地址：成都市点将台 58 号		
	电子信箱：10522070@qq.com		
	法人代表：陈泓达 联系电话：		
	授权经办人姓名：彭健伟 联系电话：02868124063		
	证件类型及号码：51502197911070731		

生产建设单位承诺内容	1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 5.积极配合水土保持监督检查。 6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7.其他需要承诺的事项： 法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）： 2021年10月11日
审批部门许可决定	上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。 建设单位应在项目开工前依法缴纳上述项目水土保持补偿费 <u>9880.00</u> 元。 水行政主管部门或者 其他审批部门（盖章） 2021年10月29日

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份。

(3) 弃土弃渣处置

关于接纳东坡 500kV 变电站主变扩建工程弃土的意见

国网四川省电力公司建设分公司

贵公司正在设计的东坡 500kV 变电站主变扩建工程位于眉山市东坡区的松江镇山坝村和思蒙镇石碓村，其施工时弃土方量约 5500 立方米，经我村民委员会商议确定，原则上同意有偿接收东坡 500kV 变电站主变扩建工程弃土 5500 立方米，弃土用于我村取土场回填利用，相关费用待项目实施前，双方再行协商。

取土场位于眉山市东坡区松江镇丁塘村一·二组，距东坡 500kV 变电站约 5 公里，属我村集体土地，后期我村委会将对其进行平整用于耕作，取土场平均深度约 2 米，占地 4.65 亩，最大容量 7750 立方米，基本能够消纳东坡 500kV 变电站主变扩建工程弃土 5500 立方米。

施工期建设单位负责将弃土运至我村取土回填，后期按取土场相关文件进行实施；建设单位在运输弃土过程中应按照有关部门要求做好防尘、防散落等防护工作，防止对运输路线沿途环境造成破坏。

眉山市东坡区松江镇丁塘村村民委员会

2021 年 8 月 31 日

村民委员会

(4) 水土保持补偿费缴纳凭证

中央非税收入统一票据(电子)

票据代码: 00010221
交款人统一社会信用代码: 91510000MA629WKP83
交款人: 国网四川省电力公司建设分公司

票据号码: 5100005582
校验码: 39ac08
开票日期: 2021年12月7日



项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额(元)	备注
30176	水土保持补偿费收入		1.0	9,880.00	¥9,880.00	15114020000
金额合计(大写) 玖仟捌佰捌拾元整					(小写) ¥9,880.00	
其他信息						

收款单位(号) 国家税务总局四川省税务局
征税专用章

复核人:

收款人: 15100wsbst0
