# 生产建设项目水土保持设施验收鉴定书

项目名称	· <u> </u>		
项目编号	自发改发〔2022〕224 号		
建设地点	自贡市大安区、沿滩区		
验收单位	国网四川省电力公司自贡供电公司		
沙1人干1工			

<u>2025</u>年 <u>10</u>月 <u>26</u>日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	自贡大安临港 110 千伏输变电工程	行业 类别	输变电 工程	
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司自贡供电公司	项目 性质	新建	
水土保持方案批复机关、 文号及时间	自贡市水务局 自水保承诺〔2023〕8号、2023年8月8日			
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	/			
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	国网四川省电力公司 川电建设〔2023〕182 号、2023		6 日	
项目建设起止时间	2023 年 9 月开工, 2025 年 6 月建成			
水土保持方案编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司			
水土保持初步设计单位	乐山城电电力工程设计有限公司			
水土保持监测单位	国网四川省电力公司自贡供电公司			
水土保持施工单位	四川和源电力有限公司			
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限	责任公司	]	
水土保持设施验收 四川电力设计咨询有限责任公司 报告编制单位				

根据水土保持法律法规、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后管理规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保(2017)365号)、《水利部关于进一步深化"放管服"改革全面加强水土保持监管的意见》(水保(2019)160号)及《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后管理规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知》(川水函(2018)887号)的要求,工程投运前需完成水土保持设施竣工验收工作,2025年10月26日,国网四川省电力公司自贡供电公司组织各参建单位完成了"自贡大安临港110千代输变电工程"水土保持设施验收竣工验收会议,参加验收的单位有建设单位国网四川省电力公司自贡供电公司、监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司、施工单位四川和源电力有限公司、验收报告编制单位四川电力设计咨询有限责任公司等单位的代表及特邀专家,会议成立了验收组(名单附后)。

验收会议前,建设单位对自贡大安临港 110 千伏输变电工程水土保持设施进行了自查初验。四川电力设计咨询有限责任公司对自贡大安临港 110 千伏输变电工程水土保持设施进行了技术验收,提交了验收报告。

验收组成员与参会代表查阅了过程现场照片及技术资料,就工程 建设过程中的水土保持问题及水土保持设施验收情况与建设单位及验 收报告编制单位沟通,经质询、讨论,形成验收意见如下:

# (一) 项目概况

自贡大安临港110千伏输变电工程由临港110kV变电站新建工程、

园湾变电站 110kV 间隔扩建工程、园湾~临港 110kV 线路工程 3 部分组成。

临港 110kV 变电站新建工程:新建 110kV 变电站 1 座,主变容量 2×63MVA,新建 110kV 出线 2 回,35kV 出线 6 回,10kV 出线 16 回,低 压并联电容器 4×5000kVar。

园湾变电站 110kV 间隔扩建工程: 扩建 2 个 110kV 出线间隔, 主要包括出线间隔电气设备基础的新建及电气设备的安装。

园湾~临港 110kV 线路工程新建线路全长 18.272km, 双回架空线路, 线路全线位于自贡市大安区、沿滩区境内, 共新建铁塔 64 基。

工程实际工期:实际于2023年9月开工,2025年6月建成,总工期22个月,2025年6月水保措施完工。

项目总占地面积 4.43hm², 其中永久占地 1.13hm², 临时占地 3.30hm²。本工程在实际建设过程中, 挖方总量为 1.230 万 m³, 填方 0.956 万 m³, 余方 0.274 万 m³。本工程未单独设置取土场。

(二) 水土保持方案批复情况(含变更)

2023年8月8日,本工程水土保持方案取得了自贡市水务局出具的水土保持行政许可承诺书(自水保承诺〔2023〕8号)。本工程水保方案中水土流失防治责任范围为4.52hm²。

(三)水土保持初步设计或施工图设计情况本项目水土保持设计纳入主体工程一并设计。

(四)水土保持监测情况

工程建设过程中未开展专项水土保持监测工作,建设单位自行对工程建设过程中的水土流失情况开展巡查监测,监测结论为:工程建

设中落实了水土保持方案确定的防治体系及任务,完成的措施基本与方案一致,有效控制和减少了工程建设中的水土流失,水土保持设施完好率较高,发挥了水土保持效益。

### (五) 验收报告编制情况和主要结论

2024年7月,建设单位委托四川电力设计咨询有限责任公司开展工程的水土保持验收报告编制工作。接受委托后,四川电力设计咨询有限责任公司成立了项目验收工作组,深入现场进行勘察,于2025年9月编制完成了《自贡大安临港110千伏输变电工程水土保持设施验收报告》。

工程实施的水保措施有: 站外排水沟 130m、站内排水管 610m、碎石压盖 2450m²、雨水检查井 16 座、表土剥离 1.07hm²/1834m³、覆土 1834m³、土地整治 3.89hm²、撒播草籽 1.47hm²,植草绿化 0.04hm²、防雨布 8750m²、土袋挡墙 315m³、钢板铺设 3740m²、密目网 580m²、临时排水沟 540m、临时沉砂池 5 个。工程质量合格,建成后水土流失已得到有效控制。

通过经济财务评估,工程实际完成的水土保持总投资为120.70万元,其中工程措施29.52万元,植物措施2.53万元,临时措施44.28万元,独立费用38.50万元,水土保持补偿费5.876万元。

经生态效益评估,该项目水土保持防治效果明显,项目建设区域内水土流失治理度 99.5%,土壤流失控制比 1.0,渣土防护率为 98.5%,表土保护率 98.2%,林草植被恢复率 99.1%,林草覆盖率 34.1%,各项水土流失防治指标均达到防治目标要求。

综上所述,本工程建设相关手续资料齐备,水土保持措施落实完善,水土保持投资满足区域水土保持防治要求,防治效果明显,满足水土保持相关法律法规要求。水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保持方案的有关规定和要求,各项工程安全可靠、质量合格,效益显著,水土保持生态环境建设设施的管理维护责任明确,工程总体质量达到了设计标准,符合验收条件,可以进行竣工验收。

### (六)验收结论

验收组认为:本项目实施过程中落实了批准的水土保持方案及相关文件要求,完成了水土流失预防和治理任务,水土流失防治指标达到水土保持方案设计的目标值,足额缴纳了水土保持补偿费,符合水土保持设施验收的条件,同意该项目水土保持设施通过验收。

### (七)后续管护要求

加强水土保持设施管护,确保正常运行和发挥效益。

# 三、项目区照片





变电站大门

临港 110kV 变电站全景图




进站道路及道路排水沟





站外排水沟







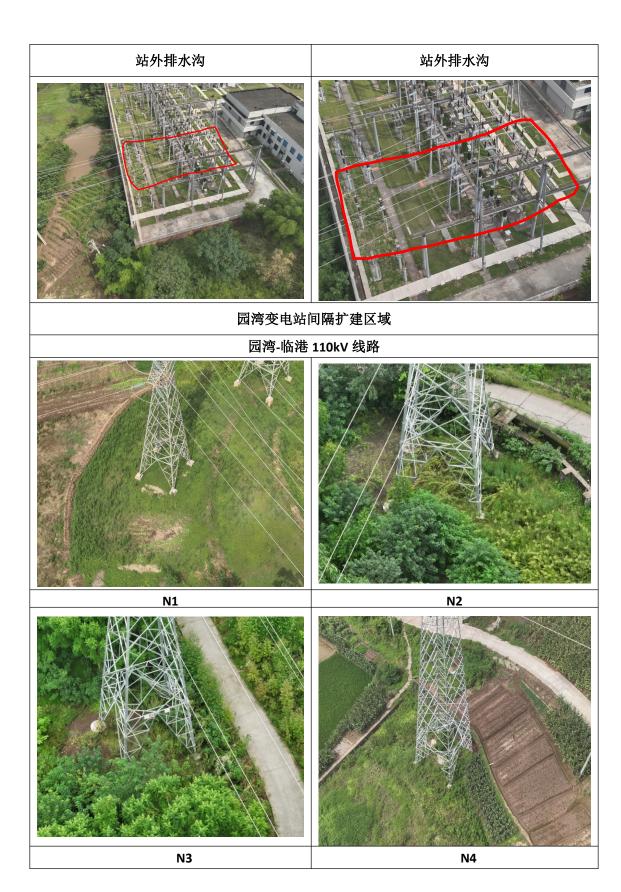


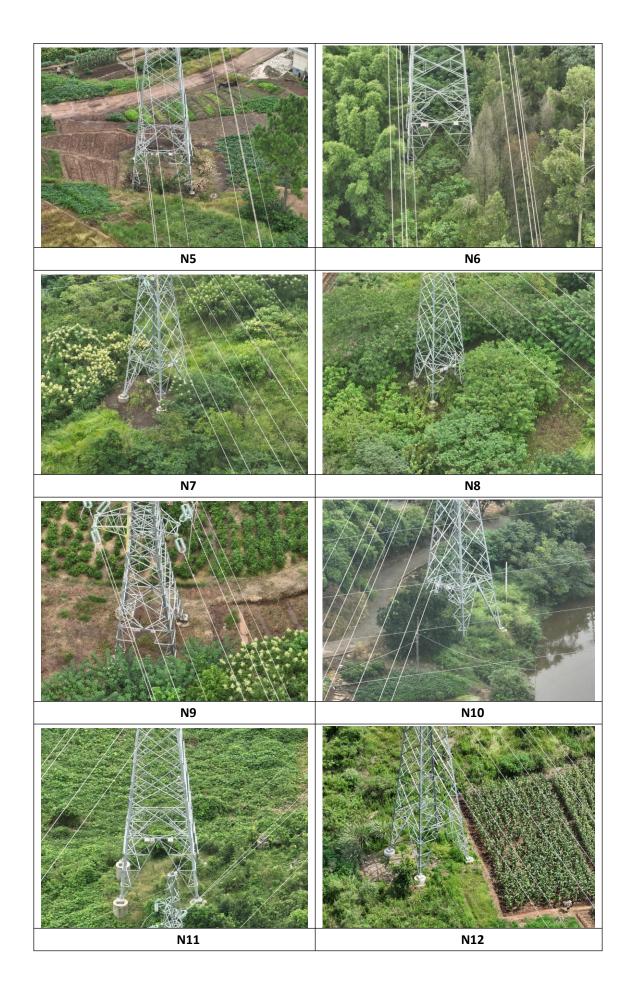


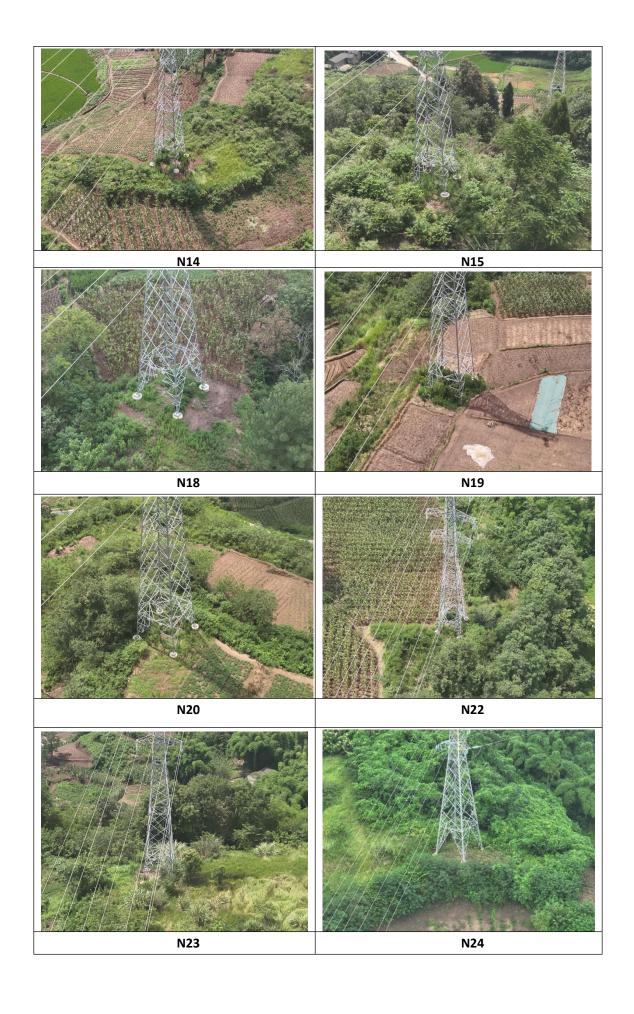


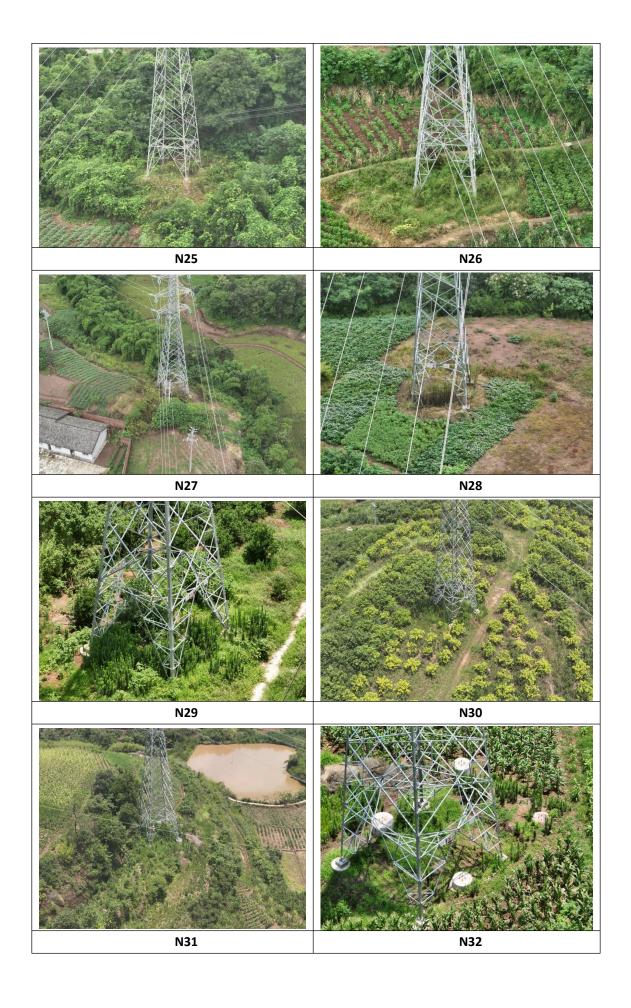

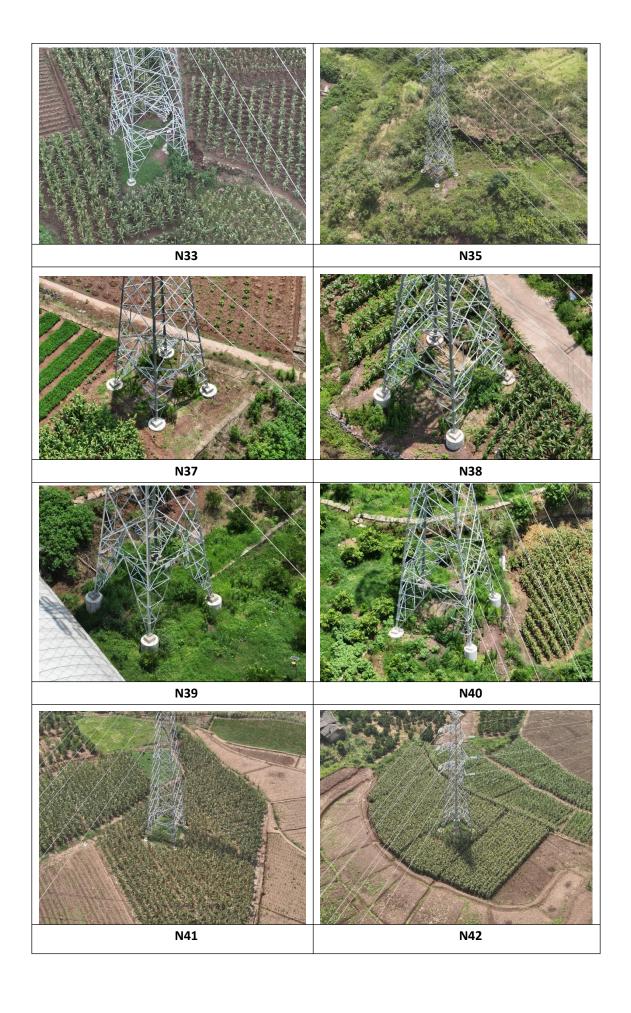

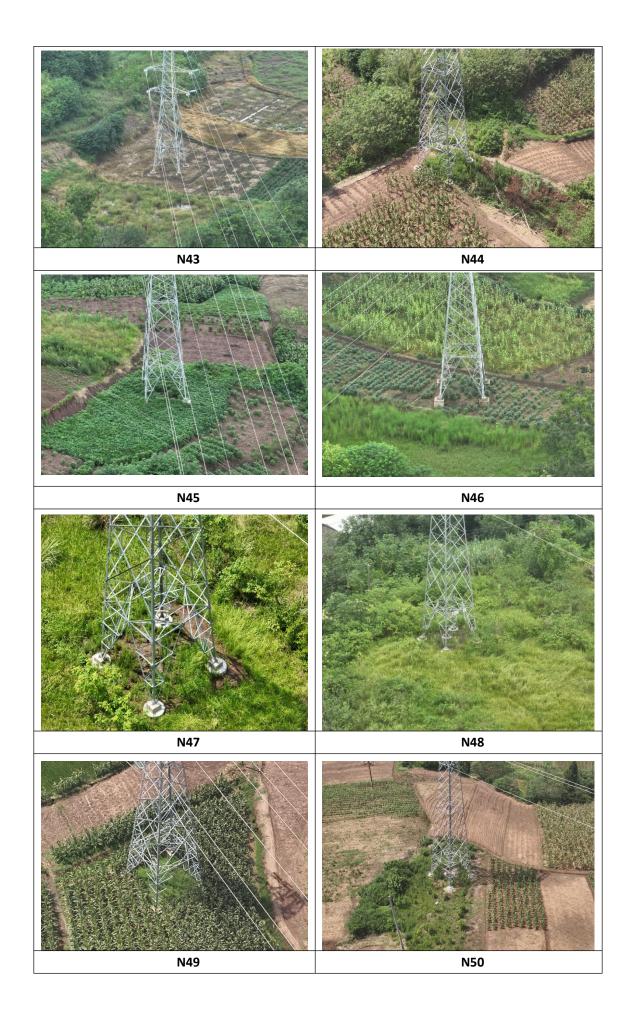

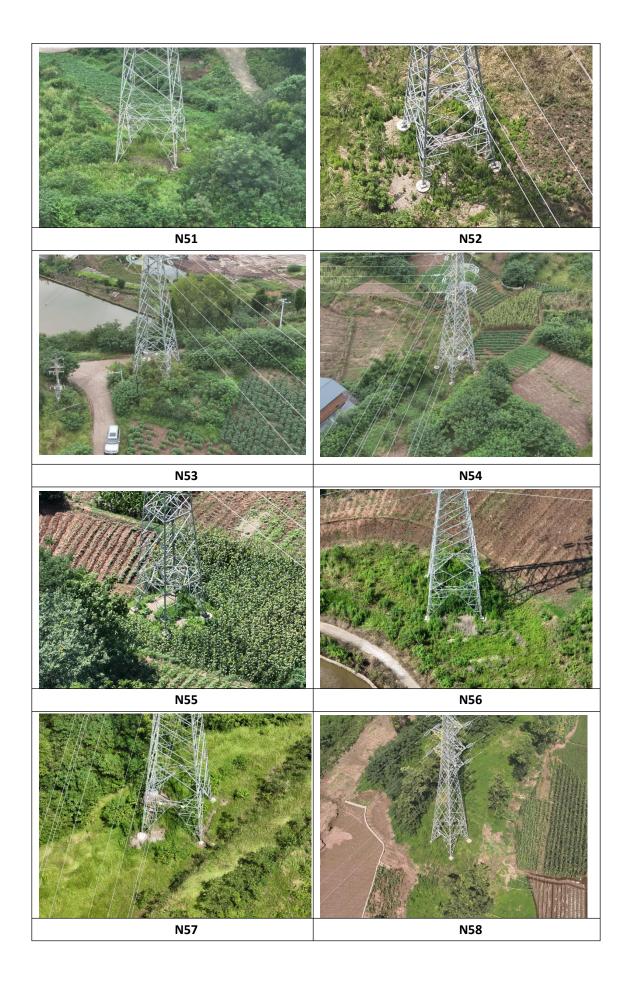

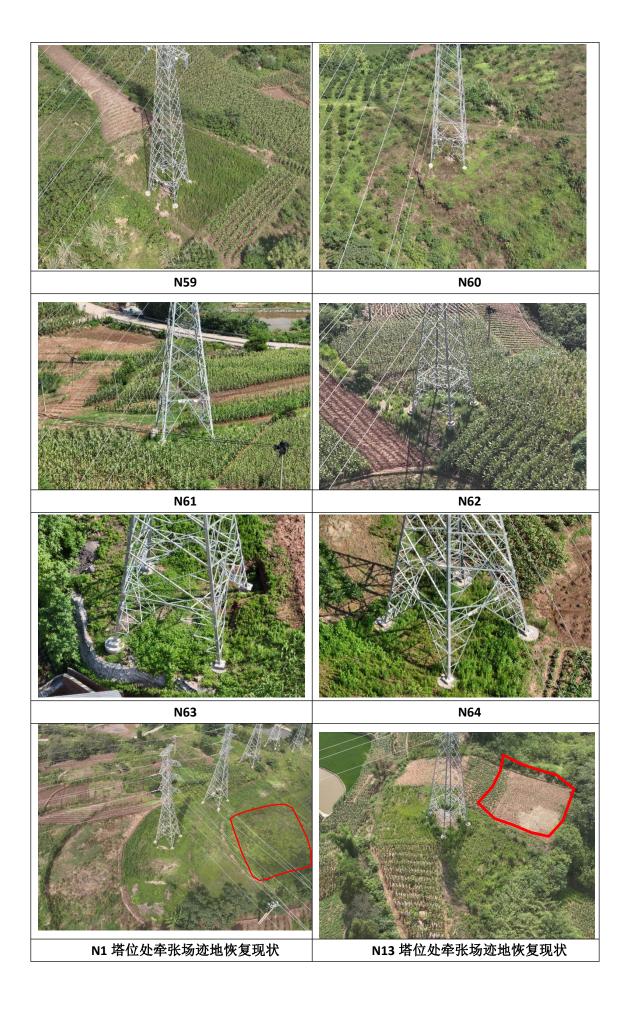



N26 塔位处牵张场迹地恢复现状



N64 塔位处牵张场迹地恢复现状



临时苫盖



临时隔离



临时苫盖



表土剥离、苫盖



临时苫盖

# 四、水土保持补偿费缴纳凭证



五、自贡市水务局出具的本项目水土保持方案行政许可承诺书 (自水保承诺〔2023〕8号)

## 水土保持行政许可承诺书

审批编号: 飲係承備[203]8爲

項目 名称	自贡大安裕港 110 千伏翰变电工程					
建设地点	項目位于自貢市大安区、沿滩区境内, 变电站站址中心坐标 104°59′07.07″E, 29°19′06.04″N。					
区域 评估	开发区名称: 无					
	水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间: 无					
水保 水保 水保 水保 水保 水 大 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	公示网站: 国网四川省电力公司官方网站 http://www.sc.sgcc.com.cn/html/main/col2749/2023-07/14/2023 071415193911222615_1.html					
	起止时间: 2023年7月14日至 2023年7月27日					
	公众意见接收和处理情况:无					
生产建设单位	名称: 国网四川省电力公司自贡强电公司					
	统一社会信用代码: 91510300620710732U					
	地址: 自贡市自流井区汇川路 1766 号 电子邮箱: 407368074@qq.com					
	法人代表: 文曹 联系电话: 0813-4605070					
	授权经办人姓名: 黄信洋 联系电话: 18381327712					
	证件类型及号码: 身份证 510322199010282853					

1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2.所填写的信息真实、完整、准确; 所提交的水土保持 方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3.严格执行水土保持"三同时"制度,按照所提交的水土保 持力案。落实各项水土保持措施、有效防治项目建设生产中 的水土流失;项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并 报备。 4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 生产 5.积极配合水土保持监督检查。 建设 6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和 失信责任。 单位 7.其他需要承诺的事项: 承诺 内容 生产建设单位(董奉 上述承诺以及提交的水土保持方案、材料完整、格式符 合规定要求,准予许可。 审批 应安水土縣博科俊菔 58768.00m 部门 许可 决定

### 备注:

- 1.本表除编号。许可决定部分外、均由生产建设单位填写。
- 2.本表"公众意见接收和处理情况"因内容较多填写不下时。可附页填写。
- 3.本表"生产建设单位承诺内容"和"审批部门许可决定"不可分割,否则无效。
  4.本表一式三份,生产建设单位、水行政主管部门、监督检查部门各执一份。

# 六、验收组成员签字表(自贡大安临港110千伏输变电工程)

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	曾家斌	国网四川省电力公司自 贡供电公司	高级工程师		建设单位
成员	张子龙	国网四川省电力公司自 贡供电公司	高级工程师		建设单位
	凌文州	中国电力工程顾问集团 西南电力设计院有限公司	正高级工程师		特邀专家
	邓川	四川电力设计咨询有限 责任公司	高级工程师		验收报告编
	杨晓瑞	四川电力设计咨询有限 责任公司	高级工程师		制单位
	吴 川	四川电力设计咨询有限 责任公司	工程师		水土保持方 案编制单位
	邓正其	四川和源电力有限公司	项目经理		施工单位
	王继龙	乐山城电电力工程设计 有限公司	设总		主体设计
	黄欣	四川东祥工程项目管理 有限责任公司	总监		监理单位
