

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：____内江隆昌平安至黄家塘边 35 千伏线路工程____
项目编号：____内发改审批〔2023〕151 号____
建设地点：____四川省内江市隆昌市____
验收单位：____国网四川省电力公司内江供电公司____

2025 年 8 月 24 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	内江隆昌平安至黄家塘边 35 千伏 线路工程	行业 类别	输变电 工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司内江供电公司	项目 性质	新建
水土保持方案批准机 关、文号及时间	内江市水利局、内水许可〔2023〕11 号、 2023 年 12 月 27 日		
水土保持方案变更批准 机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	国网四川省电力公司内江供电公司、内电基建〔2023〕20 号、2023 年 12 月 12 日		
项目建设起止时间	2024 年 10 月~2025 年 8 月，总工期 11 个月		
水土保持方案编制单位	湖北安源安全环保科技有限公司		
水土保持初步设计单位	乐山城电电力工程设计有限公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	内江星原电力集团有限责任公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	湖北安源安全环保科技有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）等有关法律法规和文件要求，2025年8月24日，建设单位国网四川省电力公司内江供电公司主持召开了内江隆昌平安至黄家塘边35千伏线路工程水土保持设施验收会议。参加会议的有设计单位乐山城电电力工程设计有限公司，监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司，施工单位内江星原电力集团有限责任公司、方案编制及水土保持设施验收单位湖北安源安全环保科技有限公司，等单位代表及特邀专家共9人，会议成立了验收组（名单附后）。

会上，验收组成员查阅了相关资料，听取了建设单位、施工单位、监理单位、水保验收单位关于本工程水土保持设施落实、水土保持监理、水土保持设施验收情况的汇报，以及水保方案编制、设计等单位的补充说明，经质询、讨论，形成水保设施验收意见如下：

（一）项目概况

1.内江隆昌平安至黄家塘边35千伏线路工程位于内江市隆昌市，项目主要建设内容为塘边35kV变电站35kV间隔扩建工程、平安110kV变电站35kV改建工程、平安~黄家35kV线路工程、平安~塘边35kV线路工程、35kV平黄线隆桥支线改接工程、35kV平

普线改接工程及相关配套设施等。项目于 2024 年 10 月开工，2025 年 8 月竣工，总工期 11 个月。

2.本项目均位于隆昌市，总占地面积 1.00 公顷，其中永久占地 0.19 公顷，临时占地 0.81 公顷。

3.本工程挖方总量 0.66 万立方米（含表土剥离 0.23 万立方米，自然方，下同），填方 0.56 万立方米（含表土利用 0.23 万立方米），余方 0.10 万立方米。其中变电工程余方 9 立方米在终端塔占地范围内进行摊平堆放；线路工程余方 0.10 万立方米在各个塔基占地范围内进行摊平堆放。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2023 年 12 月 27 日，内江市水利局以内水许可〔2023〕11 号文对项目水土保持方案报告表进行了批复。

根据批复的水土保持方案报告表，本工程建设区面积 1.02 公顷，水土流失防治责任范围面积为 1.02 公顷。防治分区划分为变电站工程区、线路工程区 2 个防治分区。

工程设计土石方开挖总 0.49 万立方米（其中表土剥离 0.20 万立方米），回填 0.49 万立方米（其中表土利用方 0.20 万立方米）。

设计的水土保持措施有：

（1）变电站工程区：碎石地坪 25 平方米、防雨布苫盖 10 平方米；

（2）线路工程区：表土剥离 2024 立方米、绿化覆土 2024 立方米、土地整治 0.72 公顷、撒播植草 0.58 公顷、土袋拦挡 75m、防雨布苫盖 1720 平方米。

水土保持总投资 29.59 万元，其中工程措施费 8.68 万元，植物措施费 0.47 万元，施工临时工程费 4.75 万元，独立费用 11.78 万元，基本预备费 2.57 万元，水土保持补偿费 1.326 万元。

方案设计的水土流失防治目标值：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1.67，渣土防护率 92%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 92%。

（三）项目的水土保持措施

本工程水土保持设施验收报告编制单位湖北安源安全环保科技有限公司通过现场查看复核，收集并查阅设计、施工、监测、监理等相关资料，经核实确定工程完成的水土保持措施有：

1.变电站工程区

（1）工程措施：碎石地坪 25 平方米；

（2）临时措施：防雨布苫盖 10 平方米。

2.线路工程区

（1）工程措施：表土剥离 2273 立方米、绿化覆土 2273 立方米、土地整治 0.97 公顷；

（2）植物措施：撒播植草 0.61 公顷、栽植灌木 114 株；

（3）临时措施：防雨布苫盖 1420 平方米。

（四）水土保持初步设计、施工图设计情况

2023 年 12 月，乐山城电电力工程设计有限公司完成《内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程初步设计报告》；2023 年 12 月 12 日，国网四川省电力公司内江供电公司以《国网四川省电力公

司内江供电公司关于内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程初步设计》（内电基建〔2023〕20 号）文件对项目初步设计进行了批复。2024 年 5 月~2024 年 7 月，乐山城电电力工程设计有限公司陆续完成了本工程的施工图卷册。在主体设计中包含有水土保持相关内容。

（五）水土保持补偿费缴纳情况

建设单位于 2024 年 1 月 16 日缴纳水土保持补偿费 13260.00 元。

（六）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）的要求，对于编制水土保持方案报告表的项目可不提供水土保持监测总结报告。本工程属编制水土保持方案报告表项目，规模很小，未开展水土保持专项监测工作，监测由施工单位、监理单位通过巡查等方式进行调查监测。

（七）水土保持监理情况

2024 年 9 月主体监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司接受委托后，及时组建了工程现场监理部（包含水土保持工程），并根据《水土流失综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《水利工程项目施工监理规范》（SL288-2014）、《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等与水土保持有关的规程、规范和技术标准及文件要求，开展水土保持工程监理工作。监理结果表明，项目建设期间，在各防治分区

采取的水土保持措施质量总体合格、外观整齐、水土保持工程布局合理，水土保持监理工作整体满足水土保持相关规程、规范的要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2023 年 4 月，建设单位委托湖北安源安全环保科技有限公司承担本项目水土保持设施验收报告编制工作。该公司接受委托后，按照水土保持法律法规和水土保持技术标准、规范，派人查阅了工程相关资料，深入工程现场进行了实地踏勘、量测，统计了各项水土保持措施数量，检查了工程质量，对建设期水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持措施的防治效果进行了实地查看和调查，于 2025 年 8 月 24 日形成了《内江隆昌平安至黄家塘边 35 千伏线路工程水土保持设施验收鉴定书》。主要结论如下：

1.经核定，该项目建设期实际发生的水土流失防治责任范围 1.00 公顷，其中永久占地 0.19 公顷，临时占地 0.81 公顷，工程防治责任范围较水保方案批复面积有所减少，主要是施工期间施工单位严格控制了施工扰动范围。

2.工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案确定的各项防治措施，完成的水土保持措施主要包括：土地整治工程、植被建设工程、降水蓄渗工程和临时防护工程，完成水土流失治理面积 1.00 公顷。经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定，水土保持措施施工质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由建设单位负责管理维护。

3.建设期实际完成的水土保持总投资为 19.82 万元，水土保持

补偿费 13260.00 元。

4.水土保持措施设计及布局总体合理，建设期各项水土流失防治指标均达到防治目标要求，其中：水土流失治理度为 98.00%，土壤流失控制比为 1.67，渣土防护率 96.97%，表土保护率 95.65%，林草植被恢复率 98.36%，林草覆盖率为 60.00%，各项指标均达到方案设定目标值。

目前各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能，水土保持设施质量评定合格，符合验收条件。

（九）验收结论

通过查阅相关验收资料和实地查看，验收组认为：内江隆昌平安至黄家塘边 35 千伏线路工程在项目建设中，认真贯彻落实了水土保持法律法规，落实了水土保持方案及批复要求，及时足额缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；对防治责任范围内的水土流失进行了较全面的治理，完成了水土保持方案确定的水土流失防治任务，各项指标均达到水土保持方案确定的防治目标；水土保持设施运行正常，水土保持设施后续管护责任已经落实，可以保证水土保持功能的有效发挥；该工程建设期实施的水土保持措施已达到生产建设项目水土保持设施验收条件，验收结论为合格，同意本项目水土保持设施通过验收。

（十）后续管护要求







1.加强水土保持设施运行期的管理，在运行期间，要对水土保持设施运行情况进行不定期巡查，特别是植物措施若有损毁要及时

采取措施恢复，确保水土保持效益长期发挥。

2.每年汛前要对工程区的排水系统进行清淤，保障水系畅通。

3.加强和完善水土保持相关资料的归档、管理，以便随时备查。

三、验收组成员签字表（内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程）

分工	姓名	单位	职称	签字	备注
组长	王 宇	国网四川省电力公司内江供电公司	高级工程师		建设单位
成员	凌文州	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	正高级工程师		特邀专家
	赵 波	国网四川省电力公司内江供电公司	工程师		建设单位
	张德伟	国网四川省电力公司内江供电公司	工程师		建设单位
	周 鑫	湖北安源安全环保科技有限公司	工程师		验收报告编制单位
	李福平	湖北安源安全环保科技有限公司	工程师		水保方案编制单位
	李文字	四川东祥工程项目管理有限责任公司	工程师		监理单位
	刘东翔	乐山城电电力工程设计有限公司	高级工程师		设计单位
	彭 超	内江星原电力集团有限责任公司	工程师		施工单位

四、相关附件

附件 1：项目现场照片

注：NA**为平安~黄家 35kV 线路工程；NB**为平安~塘边 35kV 线路工程；NC*为 35kV 平黄线隆桥支线改接工程；ND*为 35kV 平普线改接工程。

现场照片



塘边 35kV 变电站



黄家 35kV 变电站



平安 110kV 变电站



NA1



NA2



NA3 及施工道路




NA4



NA5 及施工道路



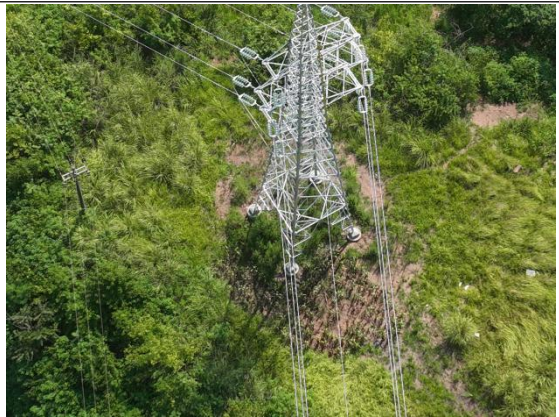NA6

	
NA6 施工道路	NA7
	
NA8	NA9
	
NA10	NA10 施工道路



NA11




NA12



NA14



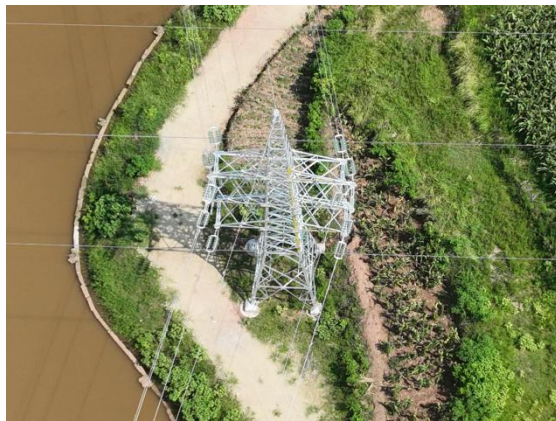NA15



NA17




NA18 及施工道路




NA19



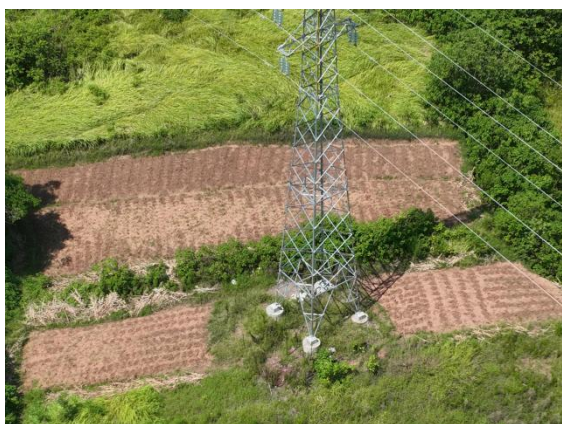NA22



NA24

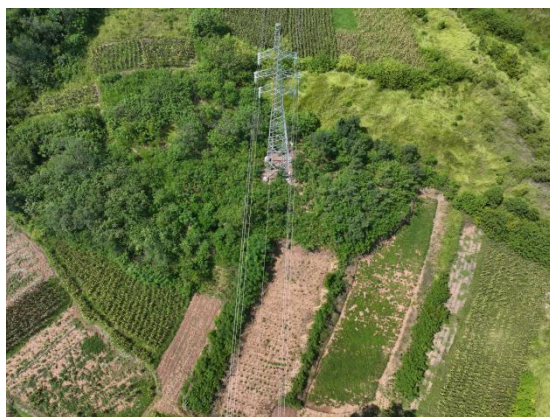

NA25



NA26 及施工道路



NA28



NA29




NA30



NA32



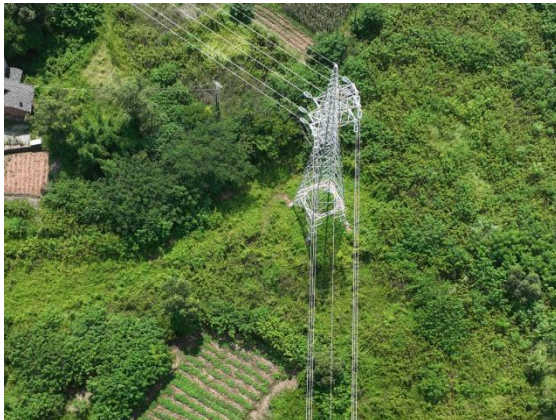
NA33



NA34



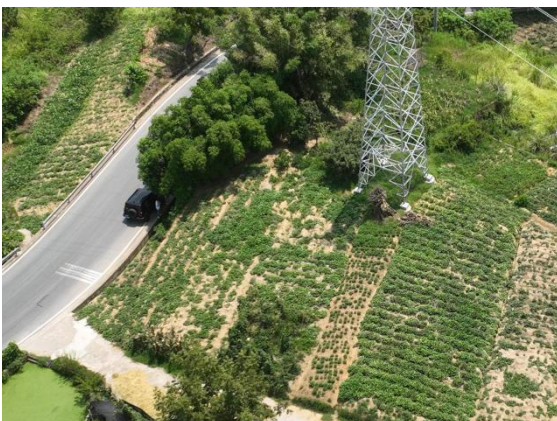NA35

	
NA36 及施工道路	NA38
	
NA39	NA40
	
NA41	NA42

	
NA43	NA44
	
NA45	NB1
	
NB2	NB3



NB5



NB6



NB7



NB8



NB9



NB10

	
NB11	NB12
	
NB13	NB14
	
NB15	NB16



NB17



NB18




NB20




NB21



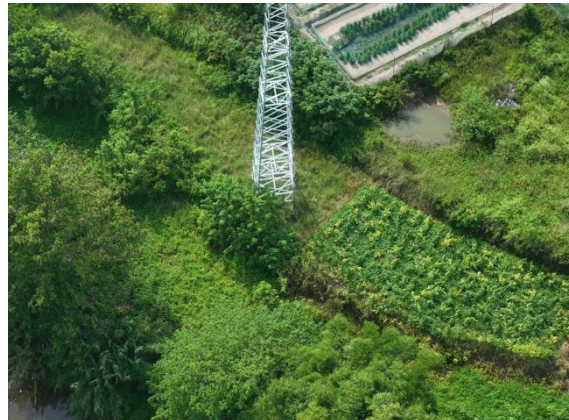NB23



NB24

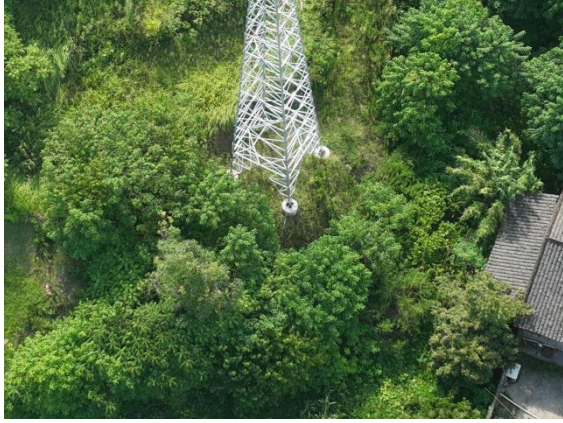

NB25



NB26




NB27



NB28



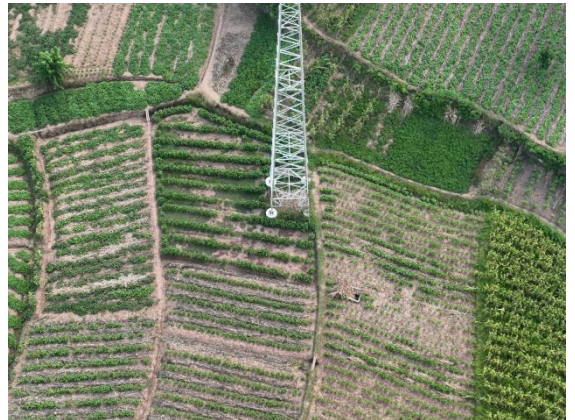NB29



NB30



NB31



NB32



NB38



NB39



NB40



NC1



NC2



ND1

附件 2:内江市发展和改革委员会关于内江隆昌平安至黄家塘边 35 千伏线路工程核准的批复(内发改审批〔2023〕151 号)

内江市发展和改革委员会文件

内发改审批〔2023〕151 号

内江市发展和改革委员会 关于内江隆昌平安至黄家塘边35千伏线路工程 核准的批复

国网内江供电公司:

你司关于《国网四川省电力公司内江供电公司关于申请核准内江隆昌平安至黄家塘边35千伏线路工程的请示》(内电发展〔2023〕5号)及相关材料收悉。经研究,现将2023年第1批10千伏及以下配网项目有关事项批复如下。

一、项目名称

内江隆昌平安至黄家塘边35千伏线路工程(项目代码:

2302-511000-04-01-585672)。

二、项目单位

国网四川省电力公司内江供电公司。

三、建设地点

四川省内江隆昌市黄家镇。

四、建设内容及规模

(一)塘边35千伏变电站35千伏间隔扩建工程。塘边站扩建1个35千伏出线间隔(至平安站)。

(二)平安110千伏变电站35千伏改建工程。在110千伏平安站两台主变35千伏中性点加装消弧线圈1台,容量630千伏安。

(三)平安至黄家35千伏线路工程。新建线路11.5千米,其中10.2千米按新建同塔双回单侧挂线,1.3千米采用架空单回架设。新建导线截面采用185平方毫米。

(四)平安至塘边35千伏线路工程。新建线路19.8千米,其中10.2千米利用平安至黄家35千伏线路工程拟建双回塔单侧挂线,9.5千米采用架空单回架设。0.1千米采用电力电缆。架空线路截面185平方毫米,电缆截面300平方毫米。

(五)35千伏平黄线隆桥支线改接工程。新建单回35千伏架空线路0.45千米,导线截面185平方毫米。

(六)35千伏平普线改接工程。新建终端塔1基,新建电缆0.15千米,电缆截面300平方毫米。

五、项目总投资及资金来源

项目总投资2663万元，资金来源为公司自筹。

六、建设工期

12个月。

七、招标内容

应严格按照《招标投标法》《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等规定和本核准要求进行招标投标活动。

八、前置条件

按照相关法律、行政法规的规定，批复项目的相关支持文件是社会风险评估。该项目已取得中共内江市委政法委员会出具的同意项目社会稳定风险备案的复函（内政法函〔2023〕8号）。

九、其他事项

（一）如需对本批复文件所规定的建设地点、建设内容及规模等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理条例》和《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

（二）请项目单位根据本批复文件，在项目开工建设前使用项目代码依法办理相关报建手续，并及时通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。

（三）项目自本批复文件印发或者同意项目变更决定之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，请在2年期限届满的30

个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期1次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。项目在2年有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本批复文件或同意项目变更决定自动失效。

附件：审批部门招标核准意见

内江市发展和改革委员会

2023年4月11日



附件

审批部门招标核准意见

建设项目名称：内江隆昌平安至黄家塘边 35 千伏线路工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	✓			✓	✓		
设计	✓			✓	✓		
施工	✓			✓	✓		
监理							✓
重要设备和材料	✓			✓	✓		

审批部门核准意见：

1. 本项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到规定标准的，必须招标。单项合同估算价达不到必须招标规模标准的，以及不适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例的，可按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定进行采购或参照政府采购方式确定承包人。

2. 采用公开招标方式的招标公告应在《全国公共资源交易平台（四川省）》和《全国公共资源交易平台（四川省·内江）》上同时发布。招标人自愿的，也可同时在其他媒介发布。

3. 招标组织形式采用委托招标的招标代理机构由招标人依法依规确定。招标过程中报送各项备案材料由招标代理机构负责（将纸质文件和电子文档各一份报送我委）。

4. 评标标准应在招标文件中详细规定，除此之外不得另行制定任何标准和细则。

5. 评标专家的确定按《四川省评标专家库管理办法》（川办发〔2003〕13号）规定执行。

6. 招标代理机构应按《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》第十三条规定逐项提供备案材料。

7. 招标人或招标代理机构应严格按照《中华人民共和国招标投标法》《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》《四川省人民政府关于进一步规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发〔2014〕62号）等规定和本核准要求进行招标投标活动。招标人应通知有关行政监督部门对开标、评标、定标进行监督。

内江市发展和改革委员会
2023年10月11日

信息公开选项：主动公开

内江市发展和改革委员会办公室

2023 年 4 月 11 日印发

附件 3：国网四川省电力公司内江供电公司关于内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程初步设计的批复（内电基建〔2023〕20 号）

普通事项

国网四川省电力公司内江供电公司文件

内电基建〔2023〕20 号

国网四川省电力公司内江供电公司关于内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程初步设计的批复

国网四川省电力公司隆昌市供电分公司：

根据《国网四川省电力公司经济技术研究院关于印发内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程初步设计评审意见的通知》（经研评审〔2023〕1306 号），经研究，原则同意该工程初步设计。现批复如下：

一、建设规模及主要技术方案

内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程包括 6 个单项工程：塘边 35kV 变电站 35kV 间隔扩建工程、平安 110kV 变电站 35kV 扩建工程、平安—黄家 35kV 线路工程、平安—塘边 35kV 线路工程、35kV

— 1 —

平黄线隆桥支线改接工程、35kV 平普线改接工程。

1.塘边35kV 变电站35kV 间隔扩建工程

本期在塘边 35kV 变电站围墙内扩建 35kV 出线间隔 1 回至平安变电站。

2.平安110kV 变电站35kV 扩建工程

本期在平安 110kV 变电站围墙内扩建 35kV 消弧线圈(630kVA),将现有 321 间隔(平隆线)、322 间隔(平普线)、324 间隔(平黄线)调整为 321 间隔(平塘线)、322 间隔(平黄线)、324 间隔(氮肥厂 T 接平普线)。

3.平安—黄家35kV 线路工程

新建架空线路路径长 11.3km。其中,单回路路径长 1.2km,同塔双回单回挂线路径长 10.1km,导线采用 JL/G1A-185/30 钢芯铝绞线。

4.平安—塘边35kV 线路工程

新建线路路径长 19.05km。其中,单回路路径长 8.9km,利用拟建双回塔单回挂线架设路径长 10.1km,导线采用 JL/G1A-185/30 钢芯铝绞线;电缆单回路路径长 0.05km,电缆采用 YJV22-26/35 3×240 电缆。

5.35kV 平黄线隆桥支线改接工程

新建架空线路路径长 0.3km。导线采用 JL/G1A-185/30 钢芯铝绞线。

6.35kV 平普线改接工程

新建电缆线路单回路长 0.13km，电缆采用 YJV22-26/353×240 交联聚乙烯电力电缆。

二、概算投资

1. 批复本输变电工程动态总投资 2392 万元，控制在核准的工程动态总投资为 2663 万元之内。工程概算汇总表见附件，工程技术方案及概算投资详见评审意见。

2. 在工程建设过程中，工程建设单位要切实加强工程建设管理，有效控制工程造价，严格按照初步设计批复开展工程建设。重大设计变更和签证费用应严格按《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》（2017 年版）规定报批。本工程应在竣工后 30 日内按《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（2019 年版）完成竣工结算。

特此批复。

附件：国网四川省电力公司经济技术研究院关于印发内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程初步设计评审意见的通知（经研评审〔2023〕1306 号）



国网四川省电力公司内江供电公司

2023 年 11 月 20 日

（此件不公开发布，发至收文单位本部。未经公司许可，严

公司内江供电公司

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

禁以任何方式对外传播和发布，任何媒体或其他主体不得公布、转载，违者追究法律责任。)

公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟

四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023

电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟

— 4 —

四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

内江供电公司 发展策划部 栗娟

部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省

2023-11-20

部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

23-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

23-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司办公室 2023 年 11 月 20 日印发

-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

2023-11-20

国网四川省电力公司内江供电公司 发展策划部 栗娟 2023-11-20

水土保持行政许可承诺书

编号：内水许可〔2023〕11号

项目名称	内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程		
建设地点	内江隆昌平安至黄家塘边 35kV 线路工程位于内江市隆昌市黄家镇、桂花井镇，平安 110kV 变电站（线路起点）地理坐标 105° 10′ 21″ E，29° 24′ 50″ N；黄家 35kV 变电站（平安-黄家 35kV 线路工程终点）105° 6′ 50″ E，29° 22′ 51″ N；塘边 35kV 变电站（平安-塘边 35kV 线路工程终点）105° 3′ 15″ E，29° 22′ 53″ N		
区域评估情况	开发区名称：无 水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间：无		
水土保持方案公开情况	公示网站：水土保持公示网 http://yanshou100.com/item_detail.html?id=263965 起止时间：2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 22 日 公众意见接收和处理情况： 无		
生产建设单位	名称：国网四川省电力公司内江供电公司 统一社会信用代码：915110009064021453 地址：内江市东兴区太白路 190 号 电子信箱：无 法人代表：甘洪 联系电话：0832-2283238 授权经办人姓名：肖贤 联系电话：0832-2283238 证件类型及号码：身份证 511025197601140317		

生产建设单位 承诺内容	1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 5.积极配合水土保持监督检查。 6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7.其他需承诺的事项：无。 法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）： 2023年12月27日
审批部门许可 决定	上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。 该项目属一般性生产建设项目，建设单位应在项目开工前按照征占用土地面积共计 <u>1.02</u> hm²（不足1m²按1m²计算），征收标准1.30元/m²向税务部门办税服务厅申报缴纳上述项目水土保持补偿费万元（<u>13260</u>元），须一次性足额缴纳。 水行政主管部门（盖章）： 2023年12月27日

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份。

附件 5：水土保持补偿费缴纳凭证

生产建设项目水土保持行政许可水土保持补偿费信息表

填表时间：2024.1.2

编号：市 2024004

项目名称	内江隆昌平安至黄家塘边 35KV 线路工程	建设地点	隆昌市
生产建设单位（个人）	国网四川省电力公司 内江供电公司	统一社会信用代码（身份证号码）	915110009064021453
法人代表姓名及电话	甘洪	经办人姓名及电话	肖贤 2283238
审批部门	内江市水利局	批复文号及时间	内水许可（2023）11 号 2023.12.27
征占用地面积（m ² ）	10200	征收标准（元/m ² ）	1.3
应缴补偿费金额（元）	13260	分成比例（央：省：市：县）	央 10%，市 90%
开工时间	2023.12	缴纳时限	2024 年 1 月 18 日前
是否免征	否	免征依据	
所属日期起	2023 年 12 月 31 日	所属日期止	2024 年 1 月 18 日
征收机关	东兴区税务局	是否涉及开采期缴费	否

填表人：周芸

审核人：苟琴

批准：王世平

填表说明：

此表一式三份，一份由水利部门或其他负责水土保持行政审批部门留存，一份由缴费人留存，一份由负责征收的税务征收机关留存（也可以用电子方式交换）

业务回单(借)

付款人户名:国网四川省电力公司	付款人账号:4402205009003400668
付款人开户行:成都芷泉支行营业室	
收款人户名:待报解预算收入-待结算财政款项(内江市级)	收款人账号:4402268011200312887
收款人开户行:中国工商银行	
币种:人民币(本位币)	小写:13,260.00
金额:壹万叁仟贰佰陆拾圆整	
业务(产品)种类:银税业务	凭证种类:
凭证号码:	摘要:代理国库税收收缴
用途:代理国库税收收缴	交易机构号:0440202050
记账柜员:00038	交易代码:00727
渠道:国库信息处理系统	
回单接收人账号:4402205009003400668	回单接收人开户证件号码:91510000621601108W

重要提示: 1、若已在银行柜台领用业务回单, 请注意核对, 勿重复记账。
2、本回单不作为收款方发货依据。

