

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程

验 收 类 型 竣工验收

建 设 地 点 四川省巴中市巴州区、巴中经开区

验 收 单 位 国网四川省电力公司巴中供电公司

2026 年 6 月 11 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司巴中供电公司	项目性质	新建建设类
水土保持方案批复机关、文号及时间	巴中市水利局、报告表（2024）05 号、2024 年 7 月 16 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网四川省电力公司巴中供电公司、巴电建设（2024）21 号、2024 年 6 月 18 日		
项目建设起止时间	2025 年 3 月~2026 年 4 月		
水土保持方案编制单位	四川省西点电力设计有限公司		
水土保持初步设计单位	四川南充电力设计有限公司		
监测单位	/		
监理单位	四川东祥工程项目管理有限公司		
施工单位	四川巴中和兴电力有限责任公司巴州分公司		
验收报告编制单位	国网（西安）环保技术中心有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号发布）、《水利部关于加强事中事后监管范围生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133 号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）等文件要求，2026 年 4 月 16 日，建设单位国网四川省电力公司巴中供电公司组织召开了巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程水土保持设施验收会议，参加会议的有设计单位四川南充电力设计有限公司，水土保持方案编制单位四川省西点电力设计有限公司，施工单位四川巴中和兴电力有限责任公司巴州分公司，水土保持监理单位四川东祥工程项目管理有限公司，水土保持设施验收报告编制单位国网（西安）环保技术中心有限公司等单位代表及特邀专家共 11 人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组代表查看了工程现场，会议期间，验收组查阅了技术资料，听取了建设单位、监理单位、水土保持设施验收技术服务单位有关水土保持设施自验情况、水土保持验收情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程水土保持设施验收意见如下。

（一）项目概况

巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程位于四川省巴中市巴州区、巴中经开区境内，由国网四川省电力公司巴中供电公司投资建设。工程由谢家 110 千伏变电站二次完善工程、谢家~化成 35 千伏线路工程、谢家~达芙妮 35 千伏线路工程、化清水支线改接至谢家 35 千伏线路工程等四部分组成。①谢家 110 千伏变电站二次完善工程：在谢家 110 千伏变电站更换 1 套 35 千伏线路光纤电流差动保护至达芙妮变，仅进行设备更换，无土建工程，无新增扰动。②谢家~化成 35 千伏线路工程：工程新建 35 千伏输电线路路径总长 9.20km，其中新建单回路电缆路径长 0.15km，新建单回路架空线路路径长 8.05km，利用谢家至达芙妮 350 千伏双回铁塔单回挂线架设线路路径长 1.0km。全线新建铁塔 18 基（直线塔 6 基、耐张塔 12 基），利用谢家~达芙妮 35 千伏线路铁塔 8 基，利用已建铁塔 1 基，新建电缆排管长 0.08km，利用已建成电缆沟长 0.07km。③谢家~达芙妮 35 千伏线路工程：工程新建 35 千伏输电线路路径总长 1.15km，其中新建同塔双回路单回挂线路径长 1.0km，新建单回电缆线路路径长 0.15km。全线新建双回路铁塔 8 基，利用谢家~化成 35 千伏线路工程电缆排管长 0.08km，利用已建成电缆沟长 0.07km。④化清水支线改接至谢家 35 千伏线路工程：工程新建 35 千伏输电线路路径总长 9.54km，其中，新建单回电缆线路路径长 0.14km，新建单回路架空线路路径长 7.00km，利用已建成双回路铁塔单回挂线路径长 2.40km。改造电缆线路路径长

0.15km。全线新建铁塔 14 基，利用已建铁塔 7 基，新建电缆排管 0.02km，利用本次谢家~化成 35 千伏线路电缆排管 0.06km，利旧电缆沟 0.07km。

工程实际开工日期为 2025 年 3 月，完工日期为 2026 年 4 月。本工程总占地面积为 1.78hm²，其中永久占地 0.27hm²，临时占地 1.51hm²。本工程总投资为 1483 万元，其中土建投资为 810.49 万元。

（二）水土保持方案批复情况

2024 年 7 月 16 日，巴中市水利局以报告表〔2024〕05 号对《巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程水土保持方案报告表》进行了行政许可。

根据行政许可的水土保持方案报告表，本工程水土流失防治责任范围为 1.80hm²，全部为项目建设区面积；项目土石方挖填总量为 0.84 万 m³，其中挖方总量 0.42 万 m³，填方总量 0.42 万 m³，无借方和弃方；水土保持投资为 38.25 万元，其中水土保持补偿费 2.34 万元。水土流失防治目标为水土流失治理度 97%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 94%、表土保护率 92%、林草植被恢复率 97%、林草覆盖率 27%。

（三）水土保持设计情况

四川南充电力设计有限公司于 2023 年 11 月编制完成了《巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程可行性研究报告》，2024 年 6 月编制完成初步设计报告，2024 年 6 月 18 日，取得《国网四

四川省电力公司巴中供电公司关于巴中巴州莲山湖 110 千伏变电站 35 千伏配套等 2 个工程初步设计的批复》（巴电建设〔2024〕21 号）；2025 年 3 月完成施工图设计，施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施；根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号），本工程水土保持方案阶段的设计和施工图阶段设计对比，施工图阶段对其进行了优化设计，施工过程中，施工单位严格按照施工图设计进行建设，工程建设不涉及水土保持重大变更。

（四）水土保持监理情况

2025 年 3 月，建设单位委托主体监理单位四川东祥工程项目管理有限公司承担了水土保持监理工作，监理单位根据有关规定及监理合同要求，组建了监理项目部。在工程建设过程中以旁站监理为主，辅以巡视调查对施工过程进行质量、进度、投资等控制。在工程建设过程中监理单位对分部工程和单位工程进行了验收，并编制完成了水土保持监理工作报告，监理工作报告中对分部工程和单位工程验收结论评价为合格。

（五）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）中简化验收报备的要求和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）等规定，本项目编制水土保持方

案报告表，可不开展水土保持监测工作。建设单位在工程施工期间督促施工单位加强了水土保持施工管理，未开展水保专项监测工作。经现场查勘，扰动地表已完成治理措施，水土保持现状良好。

（六）验收报告编制情况和主要结论

2025 年 5 月，建设单位委托国网（西安）环保技术中心有限公司承担水土保持设施验收报告编制工作。通过现场查看，收集并查阅设计、施工、监测、监理等相关资料，经核实确定：建设单位依法编报了水土保持方案，建设内容无重大变化。项目水土保持防治责任范围为 1.78hm^2 ，较水土保持方案减少 0.02hm^2 。项目实际土石方开挖总量为 0.41 万 m^3 （含表土剥离 0.06 万 m^3 ），总填方 0.41 万 m^3 （含表土回覆 0.06 万 m^3 ）；相较于水土保持方案开挖回填总量减少 0.02 万 m^3 。项目实施过程中落实了相关水土保持措施且与水土保持方案布设措施基本一致。其中工程措施：表土剥离 660m^3 ，表土回覆 660m^3 ，土地整治 1.77hm^2 。植物措施：撒播草籽 $1.20\text{hm}^2/96.00\text{kg}$ 。临时措施：临时排水沟 150m ，装土袋拦挡 20m ，防雨布苫盖 5900m^2 ，塑料布铺垫 2000m^2 ，铺棕垫 3000m^2 。水土保持措施基本完整，措施布局基本合理，发挥了水土保持防治的功能。批复中水土保持投资为 38.25 万元，项目实际水土保持投资为 30.38 万元，相较于水土保持方案概算投资减少了 7.87 万元。建设单位国网四川省电力公司巴中供电公司已于 2024 年 9 月 25 日，足额缴纳了本工程水土保持补偿费 23400 元。水土保持方案确定的防治任

务基本完成，其中，水土流失治理度 98.88%，土壤流失控制比为 1.04，渣土防护率为 96.51%，表土保护率为 99.55%，林草植被恢复率为 98.33%，林草覆盖率为 66.29%，6 项水土流失防治指标均达到或超过方案制定的目标值，无水土流失风险隐患；项目水土保持设施后续管理、维护责任已落实；因此，项目水土保持设施具备验收条件。

（七）验收结论

验收组认为建设单位依法编报了本项目水土保持方案，主体工程各阶段设计包括水土保持内容，符合相关标准要求；足额缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序合法完备，该工程基本落实了水土保持方案要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，无水土流失风险隐患，水土保持设施管护责任明确，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（八）后续管护要求

运行管理单位应加强水土保持设施的巡查、管护，以保证水土保持设施持续发挥效益。

三、验收组成员签字表（巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程）

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长		国网四川省电力公司巴中供电公司	副主任		建设单位
成员		国网四川省电力公司巴中供电公司	高 工		
		国网四川省电力公司巴中供电公司	项目经理		
	王琳琳	国网（西安）环保技术中心有限公司	高 工		水保验收报告编制单位
	白佳慧	国网（西安）环保技术中心有限公司	工程师		
	石 飞	国网（西安）环保技术中心有限公司	工程师		
		四川东祥工程项目管理有限责任公司	总 监		水保监理单位
		四川省西点电力设计有限公司	工程师		水保方案编制单位
		四川南充电力设计有限公司	设 总		设计单位
		四川巴中和兴电力有限责任公司巴州分公司	项目经理		施工单位
			正 高		特邀专家

四、相关附件

附件 1：项目现场照片



A7 塔基及施工场地




A8 塔基及施工场地



A9 塔基及施工场地



A10 塔基及施工场地

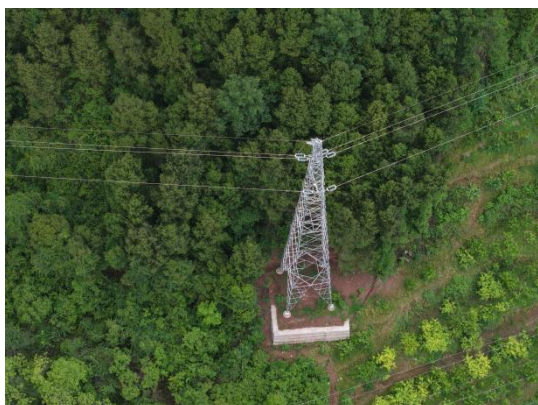

A11 塔基及施工场地



A12 塔基及施工场地



A13 塔基及施工场地



A14 塔基及施工场地



N8 塔基及施工场地




N9 塔基及施工场地



N10 塔基及施工场地



N11 塔基及施工场地

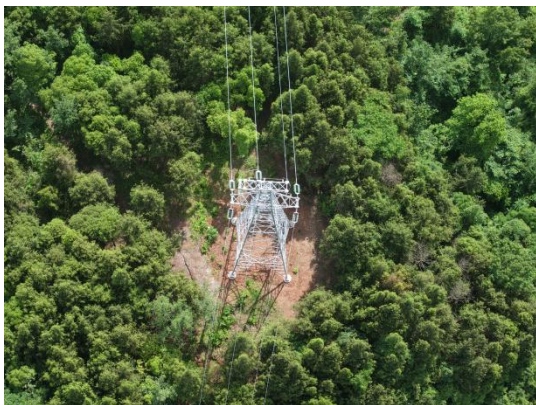

N12 塔基及施工场地



N13 塔基及施工场地



N14 塔基及施工场地



N15 塔基及施工场地



N16 塔基及施工场地



N17 塔基及施工场地



N18 塔基及施工场地



N19 塔基及施工场地



N20 塔基及施工场地



N21 塔基及施工场地



N22 塔基及施工场地



N23 塔基及施工场地



N24 塔基及施工场地



N25 塔基及施工场地



N26 塔基及施工场地

巴中市发展和改革委员会文件

巴发改审〔2023〕66 号

巴中市发展和改革委员会 关于巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套 工程核准的批复

国网四川省电力公司巴中供电公司：

你司《关于核准巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程的请示》（巴电公司〔2023〕26 号）收悉。为解决 35 千伏家清线重载及供区 35 千伏变电站串供问题，减轻玉堂 110 千伏变电站供电压力，优化片区 35 千伏网架结构，提高供电可靠性，经研究，原则同意该项目建设。现就项目核准事项批复如下：

— 1 —

一、项目名称

巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程。

二、项目代码

2312-511900-04-01-107451。

三、项目单位

国网四川省电力公司巴中供电公司。

四、建设地点

巴中市巴州区、巴中经开区。

五、建设规模及主要内容

（一）完善谢家 110 千伏变电站二次工程，其中谢家 110 千伏变电站更换 35 千伏线路光纤差动保护装置 1 套，更换 0.2S 级智能电能表 1 只，新增数据通信网光模块 3 块，新增 155Mb/s 双光口板 2 块。

（二）完善达芙妮 35 千伏变电站二次工程，其中达芙妮 35 千伏变电站新增 35 千伏线路光纤差动保护装置 1 套，新增数据通信网光模块 1 块，新增 155Mb/s 双光口板 1 块。

（三）新建谢家-化成 35 千伏线路工程，其中架空线路 9.8 千米，1.2 千米利用谢家-达芙妮 35 千伏线路工程新建双回单回挂线，8.6 千米按单回架设，导线截面采用 185 平方毫米；新建电缆线路 0.19 千米，按单回敷设，电缆截面采用 240 平方毫米；本工程利用已建电缆沟通道长 0.1 千米，新建排管通道长 0.06 千米，新建直埋长 0.03 千米；改造原谢家-清江 35kV 线路电缆线路 0.16 千米，电

缆截面采用 240 平方毫米;改建段利用已建电缆沟通道长 0.08 千米,排管利用拟建谢家至化成 35 千伏电缆排管通道敷设 0.06 千米,新建直埋长 0.02 千米。

(四)新建谢家-达芙妮 35 千伏线路工程,其中架空线路 1.2 千米,按同塔双回单回挂线,导线截面采用 240 平方毫米;新建电缆线路 0.19 千米,按单回敷设,电缆截面采用 300 平方毫米;本工程利用已建电缆沟通道长 0.1 千米,排管利用谢家—化成 35 千伏线路工程拟建的排管通道长 0.06 千米,新建直埋长 0.03 千米。

(五)改接化清水支线至谢家 35kV 线路工程,其中新建架空线路 7.4 千米,2.7 千米利用已建同塔双回单回挂线,4.7 千米按单回架设,导线截面采用 185 平方毫米;新建电缆线路 0.16 千米,按单回敷设,电缆截面采用 240 平方毫米。本工程利用已建电缆沟通道长 0.08 千米,排管利用谢家—化成 35 千伏线路工程拟建的排管通道长 0.06 千米,新建直埋长 0.02 千米。

六、项目总投资及资金来源

项目总投资为 1765 万元。其中国网四川省电力公司出资 20% 做为项目资本金,其余通过银行贷款解决。

七、项目耗能

项目建成后年综合消耗能源 113.67 吨标准煤(当量值)、303.37 吨标准煤(等价值),其中年电能损耗 92.49 万千瓦时。年耗能符合《能源管理体系要求》,原则同意该项目固定资产能耗统计表。

八、招标事项核准意见

详见附表。

九、其他事项

（一）如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

（二）本核准文件有效期为2年，自发文之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设的项目，应在核准文件有效期届满30个工作日内向我委申请延期开工建设，开工建设只能延期1次，期限最长不超过1年，国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

（三）法律法规要求需在项目开工前办理的相关手续，应在开工前办理齐全。要严格按照电力工程的标准和质量进行建设，加强工程质量管理，按期完成工程进度，项目投产后及时组织竣工验收。

（四）项目单位应将安全管理贯穿于项目建设全过程，加强安全生产知识教育，逗硬落实安全生产责任，完善项目安全防护措施，确保项目安全快速有序建设。

巴中市发展和改革委员会

2023年12月14日



建设项目招标事项核准意见

项目名称: 巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式	招标估算金 额(万元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标			
勘 察	全部招标			委托招标	公开招标			1765	
设 计	全部招标			委托招标	公开招标				
施 工	全部招标			委托招标	公开招标				
监 理	全部招标			委托招标	公开招标				
重要设备材料	全部招标			委托招标	公开招标				

说明:

1. 招标范围: 勘察、设计、施工、监理、与工程建设有关的重要设备及材料等达到《必须招标的工程项目规定》规定的必须招标标准的, 依法依规进行招标; 同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购, 合同估算价合计达到《必须招标的工程项目规定》规定的必须招标标准的, 依法依规进行招标。未达到《必须招标的工程项目规定》规定的必须招标标准, 按照法律法规等规定应当进行政府采购的, 按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定执行; 国有企业作为项目业主的, 应当建立健全规模标准以下工程建设项目采购制度, 推进采购活动公开透明。

2. 招标方式: 公开招标。

3. 招标组织形式: 委托招标。招标代理机构按照《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》有关规定确定, 通过比选方式确定招标代理机构的, 应当在全国公共资源交易平台(四川省)(四川公共资源交易信息网)发布招标代理机构比选公告。

招标人和招标代理机构在招标活动中应注意以下事项:

(1) 评标标准应在招标文件中详细规定, 除此之外不得另行制定任何标准和细则。

(2) 开标、抽取评标专家、评标必须在公共资源交易服务中心进行(具体地点在招标文件中规定)。招标人应通知有关行政主管部门对开标、抽取评标专家、评标进行监督。

(3) 招标人或招标代理机构应按严格招标投标有关法律法规规定落实招标投标情况报告制度, 在每发布或形成相关资料后 5 个工作日内, 向我委逐项提交招标代理机构确定资料、招标文件、评标报告及评标结果公示、中标通知书、承包合同及中标结果公示等招投标相关资料, 提交的相关资料应当为原件或加盖鲜章(骑缝章)的复印件。

(4) 招标人应严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等法律、行政法规、地方规章和本核准意见进行招标活动。

巴中市发展和改革委员会
2023 年 12 月 14 日

信息公开选项：主动公开

抄送：巴中市巴州区发展和改革委员会、巴中经开区科发局、巴中市自然资源和规划局巴州分局、巴中市自然资源和规划局巴中经济开发区分局。

巴中市发展和改革委员会行政审批科

2023 年 12 月 14 日印发

(共印 6 份)

普通事项

国网四川省电力公司巴中供电公司文件

巴电建设〔2024〕21 号

国网四川省电力公司巴中供电公司 关于巴中巴州莲山湖 110kV 变电站 35kV 配套等 2 个工程初步设计的批复

国网四川省电力公司巴中市巴州供电分公司：

《国网四川省电力公司巴中市巴州供电分公司关于呈批巴中巴州莲山湖 110kV 变电站 35kV 配套等 2 个工程初步设计的请示》（巴供电发展〔2024〕5 号）收悉。经研究，原则同意巴中巴州莲山湖 110kV 变电站 35kV 配套等 2 个工程初步设计。现批复如下：

一、建设规模及主要技术方案

（一）巴中巴州莲山湖 110kV 变电站 35kV 配套工程

— 1 —

巴中巴州莲山湖110kV 变电站35kV 配套工程包括2个单项工程：莲山湖110kV 变电站35kV 配套线路工程、系统通信工程。

1.莲山湖110kV 变电站35kV 配套线路工程

新建线路路径长1.75km。其中，新建架空单回路长0.5km，同塔双回路长0.8km，增容换线单回路长0.32km，导线均采用 JL/G1A-240/30钢芯铝绞线；搭接线路路径长0.03km，导线利旧；电缆双回路长0.1km，电缆采用 YJV22-26/35 3×300电缆。

2.系统通信工程

莲山湖变新增155Mb/s 四光口光板1块、48芯光纤配线单元1套；南龛变新增光模块1个；城西变新增光模块1个、24芯光纤配线单元1套。

(二) 巴中巴州谢家110kV 变电站35kV 配套工程

巴中巴州谢家110kV 变电站35kV 配套工程包括4个单项工程：谢家110kV 变电站二次完善工程、谢家—达芙妮35kV 线路工程、谢家—化成35kV 线路工程、化清水支线改接至谢家35kV 线路工程。

1.谢家110kV 变电站二次完善工程

谢家变更换1套35kV 线路光纤电流差动保护至达芙妮变。

2.谢家—达芙妮35kV 线路工程

新建线路路径长1.15km。其中，架空同塔双回单回挂线路长1 km，导线采用 JL3/G1A-240/30钢芯高导电率铝绞线；电缆单回路长0.15km，电缆采用 YJV22-26/35 3×300电缆。

3.谢家—化成35kV 线路工程

新建线路路径长9.35km。其中，架空单回路路径长8.2km，利用拟建双回杆塔单回挂线架设路径长1km。导线采用 JL/G1A-185/30 钢芯铝绞线；电缆单回路路径长0.15km，电缆采用 YJV22-26/35 3×240 电缆。

4.化清水支线改接至谢家35kV 线路工程

新建线路路径长7.14km。其中，架空单回路路径长4.6km，利用已建双回杆塔单回挂线架设2.4km，导线采用 JL/G1A-185/30 钢芯铝绞线；电缆单回路路径长0.14km，电缆采用 YJV22-26/35 3×240 电缆。

改造电缆线路路径长0.15km，按单回敷设，电缆采用 YJV22-26/35 3×240 电缆。

二、概算投资

（一）巴中巴州莲山湖 110kV 变电站 35kV 配套工程概算静态总投资 365 万元，动态总投资 368 万元，控制在核准的动态总投资 395 万元以内。工程概算汇总表见附件。工程技术方案及概算投资详见评审意见。

（二）巴中巴州谢家 110kV 变电站 35kV 配套工程概算静态总投资 1648 万元，动态总投资 1662 万元，控制在核准的动态总投资 1765 万元以内。工程概算汇总表见附件。工程技术方案及概算投资详见评审意见。

（三）在工程建设过程中，工程建设单位要切实加强工程建设管理，有效控制工程造价，严格按照初步设计批复开展工程建

设。设计变更和签证费用应严格按《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》（2017年版）规定报批。本工程应在竣工后60日内按《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（2019年版）完成竣工结算。

特此批复。

附件：巴中巴州莲山湖 110kV 变电站 35kV 配套等 2 个工程概算汇总表



（此件不公开发布，发至收文单位本部。未经公司许可，严禁以任何方式对外传播和发布，任何媒体或其他主体不得公布、转载，违者追究法律责任。）

巴中巴州谢家 110kV 变电站 35kV 配套工程概算汇总表

金额单位：万元


序号	工程或费用名称	建设规模	静态投资			动态投资
			静态投资	其中：场地征 用及清理费	单位投资（元/kVA、 万元/km）	
一	变电工程		53			53
1	谢家 110kV 变电站二次完善工程		53			53
二	输电线路工程		1595	149		1609
1	谢家—达芙妮 35kV 线路工程		354	14		357
1.1	谢家—达芙妮 35kV 线路工程（架空部分）	单回路 1km	315	14	315	318
1.2	谢家—达芙妮 35kV 线路工程（电缆部分）	单回路 0.15km	39		260	39
2	谢家—化成 35kV 线路工程		711	83		717
2.1	谢家—化成 35kV 线路工程（架空部分）	单回路 9.2km	635	83	69	640
2.2	谢家—化成 35kV 线路工程（电缆部分）	单回路 0.15km	76		507	77
3	化清水支线改接至谢家 35kV 线路工程		530	52		535
3.1	化清水支线改接至谢家 35kV 线路工程（架空部分）	单回路 7km	459	52	66	463
3.2	化清水支线改接至谢家 35kV 线路工程（电缆部分）	单回路 0.29km	71		245	72

三	合计			1648	149		1662
	其中：可抵扣固定资产增值税			125			

水土保持行政许可承诺书

编号：（报批表(2024)05号）

项目名称	巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程	
建设地点	巴中巴州谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程位于巴中市巴州区、巴中经开区境内。谢家 110kV 变电站位于巴中经开区兴文街道，化成 35kV 变电站位于巴州区化成镇，达芙妮 35kV 变电站位于巴中经开区兴文街道。谢家~化成 35kV 线路工程起于谢家 110kV 变电站，止于化成 35kV 变电站，线路全长 9.35km，全线途经兴文街道、化成镇。谢家~达芙妮 35kV 线路工程起于谢家 110kV 变电站，止于达芙妮 35kV 变电站，线路全长 1.15km，全线位于兴文街道。化清水支线改接至谢家 35kV 线路工程起于谢家 110kV 变电站，止于原化清水支线 2#塔，线路全长 7.14km，全线途经兴文街道、清江镇。	
区域评估情况	开发区名称：无	
	水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间：无	
水土保持方案公开情况	公示网站：国家电网-国网四川省电力公司 http://www.sc.sgcc.com.cn/html/main/col2749/2024-06/27/20240627175405532137784_1.html	
	起止时间：2024 年 6 月 27 日-2024 年 7 月 10 日	
	公众意见接受和处理情况：无	
生产建设单位	名称：国网四川省电力公司巴中供电公司	
	统一社会信用代码：91511900X304300873	
	地址：巴中市巴州区江北大道中段 55 号 电子邮箱：542661680@qq.com	
	法人代表：戴海宁 联系电话：0827-5621001	
	授权经办人姓名：颜诚 联系电话：0827-5621115 证件类型及号码：身份证/510105197609071773	

生产建设单位承诺内容	1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。 2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。 5.积极配合水土保持监督检查。 6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7.其它需承诺的事项：本项目总占地面积 1.80 公顷，按 1.3 元/平方米计算，水土保持补偿费 2.34 万元。  法人代表（签字）： 生产建设单位（盖章）：国网四川省电力公司巴中供电公司 2024 年 7 月 16 日
审批部门许可决定	上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，依法缴纳水土保持补偿费 2.34 万元，准予许可。  水行政主管部门或者 其他审批部门（盖章）  2024 年 7 月 16 日

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式 3 份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执 1 份。

附件 5：水土保持补偿费缴费凭证

00010224
缴费代码
纳税人识别号：91511900X304300873
缴费人：国网四川省电力公司巴中供电公司
收款人

中央非税收入统一票据
中央
财政票据

票据号码：5119008320
校验码：5b5dbf
开票日期：2024 年 9 月 25 日



项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额(元)	备注
30176	水土保持补偿费收入		1	6,110.00	¥6,110.00	电子税票号码： 3511982409000000020
30176	水土保持补偿费收入		1	104,650.00	¥104,650.00	正税 主管税务所（科、 分局）：国家税务总局巴 中市巴州区税务局江北 税务分局
30176	水土保持补偿费收入		1	38,220.00	¥38,220.00	
30176	水土保持补偿费收入		1	23,400.00	¥23,400.00	
金额合计（大写）：人民币壹拾柒万贰仟叁佰捌拾元整					¥172,380.00	
巴中巴州莲山湖 110KV 变电站 35KV 配套工程 巴中曾口 220KV 变电站 110KV 配套工程 巴中巴州莲山湖 110KV 输电工程 巴中巴州 谢家 110 千伏变电站 35 千伏配套工程						

国家税务总局巴中市巴州区税务局
11号

征税专用章

收款人：薛帅
